



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PROGRES PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

MINGGU KE - 35

PERIODE : 7 s/d 13 Agustus 2026

DATA PENGADAAN BARANG/JASA

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)

No	Nama Paket	SYC/MYC	Periode Tender	Penetapan Pemenang	Tgl SPMK	Nilai Pagu	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak	Penyedia Jasa
1.	Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025 – 2026)	MYC 2025/2026	26 Nov – 5 Des 2025	8 Des 2025	12 Des 2025	Pagu Total Rp 27,770,160,000 Pagu TA.2025 Rp 4,804,553,000 Pagu TA.2026 Rp 22.965.607.000	Pagu Total Rp 27.342.794.302 Pagu TA.2025 Rp 4.784.989.003 Pagu TA.2026 Rp 22.964.805.299	Adendum IV HK.02.01/SPK/B p.13.6.2/ADD.IV/ 090/VI/2026	PT. Surya Mega Jaya
2.	MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025 – 2026)	MYC 2025/2026	16 Okt - 11 Desember 2025	5 Des 2025	16 Des 2025	Pagu Total Rp 1.410.640.000 Pagu TA.2025 Rp 244.057.000 Pagu TA.2026 Rp. 1.166.583.000	Pagu Total Rp. 1.389.485.790 Pagu TA.2025 Rp 243.207.215 Pagu TA.2026 Rp 1.146.278.575	HK.02.01/SPK/B p.13.6.2/21/MK/ XII/2025	PT. Laras Sembada KSO PT Citra Yasa Persada
3.	Meubelair Rumah Susun	SYC 2026	-	-	-	Rp -	Rp -	-	-

RINCIAN PROGRES KEUANGAN DAN PEMBAYARAN

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



PROGRES KEUANGAN MYC 2025 - 2026			%
Pembangunan	:	Rp. 25.421.192.266	91,608 %
Manajemen Konstruksi	:	Rp 1.197.002.986	86,147%

UANG MUKA			%
Pembangunan	:	Rp 4.101.419.145	15 %
Manajemen Konstruksi	:	Rp 208.422.868	15%

PROGRES KEUANGAN									
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI					PENYEDIA JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI				
Termin	Presentase (%)	Nilai Termin	Tanggal SP2D	Keterangan	Termin	Presentase (%)	Nilai Termin	Tanggal SP2D	Keterangan
UM	15	Rp 4.101.419.145	24 Des 2025		UM	15	Rp 208.422.868	29 Des 2025	
1	2,5	Rp. 683.569.858	24 Des 2025		1	2,5	Rp. 34.784.347	29 Des 2025	
2	8,5	Rp. 2.324.137.516	13 Feb 2026		2	5,821	Rp 80.889.269	20 Jan 2026	
3	8,5	Rp. 2.324.137.516	26 Feb 2026		3	7,992	Rp. 110.989.416	19 Feb 2026	
4	8,5	Rp. 2.324.137.516	15 April 2026		4	7,992	Rp. 110.989.416	12 Mar 2026	
5	8,5	Rp. 2.324.137.515	5 Mei 2026		5	10,262	Rp. 142.594.446	16 April 2026	
6	8,5	Rp. 2.324.137.515	22 Mei 2026		6	10,302	Rp. 143.149.446	22 Mei 2026	
7	10,625	Rp. 2.905.171.895	22 Juni 2026		7	10,274	Rp. 142.760.946	22 Juni 2026	
8	11	Rp. 3.055.171.895	7 Juli 2026		8	8,003	Rp. 111.211.416	20 Juli 2026	
9	11	Rp. 3.055.171.895	3 Agustus 2026		9	8,003	Rp. 111.211.416	13 Agustus 2026	



STATUS: JULI 2026 (MINGGU KE-34)	
PROGRES PER TA. 2026	
Realisasi Fisik (%)	95,980%
Rencana Fisik (%)	83,429%
Deviasi (%)	+12,551%
PROGRES MYC	
Realisasi Fisik (%)	95,980%
Rencana Fisik (%)	83,429%
Deviasi (%)	+12,551%
STATUS PBG	
PBG Sudah Terbit per tanggal 23 Juni 2026	

A. DATA KONTRAK	
1. DATA UMUM BANGUNAN RUSUN	
Alamat	Jl. Aneka Tambang, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Penerima Manfaat	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
Koordinat	3°29'13,443°S, 114°50'24,067°E
Jenis dan Tipe Rusun	Wisma Arunika / 3 Lantai
Jumlah Tower / Unit	1 Tower / 44 Unit
2. PENYEDIA JASA	
Kontraktor Pelaksana	PT. Surya Mega Jaya
Nomor Kontrak	HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/016/XII/2025
Tanggal Kontrak	12 Des 2025
Nomor SPMK	SPMK.16/Bp13.6.2/PK/XII/2025
Tanggal SPMK	12 Des 2025
Waktu Pelaksanaan	300 Hari Kalender (12 Des 2025 – 7 Okt 2026)
Nilai Pagu	Pagu Total Rp 27,770,160,000 Pagu TA.2025 Rp 4,804,553,000 Pagu TA.2026 Rp 22.965.607.000
Nilai Kontrak	Pagu Total Rp 27.342.794.302 Pagu TA.2025 Rp 4.784.989.003 Pagu TA.2026 Rp 22.557.805.299
2.A ADDENDUM IV	
Nomor Addendum	HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.IV/090/VI/2026
Tgl Addendum	30 Juni 2026
Periode Addendum	30 Juni 2026 – 7 Oktober 2026
Nilai Addendum	Rp 27.749.794.302
Hal	Pekerjaan Tambah kurang, Pek. Baru

3. MANAJEMEN KONSTRUKSI	
Manajemen Konstruksi	PT. Laras Sembada KSO PT Citra Yasa Persada
Nomor Kontrak	HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/21/MK/XII/2025
Tanggal Kontrak	16 Des 2025
Nomor SPMK	SPMK.22/Bp.13.6.2/MK/XII/2025
Tanggal SPMK	16 Des 2025
Waktu Pelaksanaan	300 Hari Kalender (16 Des 2025 – 11 Okt 2026)
Nilai Pagu	Pagu Total Rp 1.410.640.000 Pagu TA.2025 Rp 244.057.000 Pagu TA.2026Rp. 1.166.583.000
Nilai Kontrak	Pagu Total Rp. 1.389.485.790 Pagu TA.2025 Rp 243.207.215 Pagu TA.2026 Rp 1.146.278.575
3.A ADDENDUM II	
Nomor Addendum	HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.III/59/MK/III/2026
Tgl Addendum	12 Maret 2026
Periode Addendum	12 Maret 2026 – 11 Oktober 2026
Nilai Addendum	Rp. 1.389.485.590
Hal	Perubahan personel inti
4. PENYEDIA JASA MEUBELAIR	
Manajemen Konstruksi	
Nomor Kontrak	
Tanggal Kontrak	
Nomor SPMK	
Tanggal SPMK	
Nilai Pagu	
Nilai Kontrak	

SPESIFIKASI TEKNIS

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026



DATA UMUM BANGUNAN RUMAH SUSUN

1	Status Lahan	:	Sertifikat Hak Pakai
2	Ketinggian Bangunan	:	15,74 m
4	Luas Lahan	:	25000 m2
5	Luas Area Bangunan	:	2767,68 m2
6	Perijinan	:	Dalam proses
8	Kapasitas Daya Listrik	:	164.600 VA
9	Fasilitas lainnya	:	Air Conditioner (3 Unit/Sarusun)

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN

1	Struktur	:	• Mini Pile 25 cm x 25 cm (fc' 40,67MPa) • Pile Cap (fc' 25 MPa) • Tie Beam (fc' 25 MPa) • Kolom (fc' 25 MPa) • Balok (fc' 25 MPa) • Ring Balok (fc'25 Mpa) • Plat Lantai (fc' 25 MPa) • Rangka Atap Baja Profil (fy 240 MPa)
2	Penutup atap	:	Atap Atap Spandek Berpasir :Bluescope, Maharooft, Atap Teduh, Sakura Roof
3	Dinding	:	Bata Ringan : Grand Elephant, Citicon, Bricon, Blesscon Plester & Acian Grand Elephant, Citicon, Bricon, Blesscon
4	Cat	:	.Jotun, ICI Dulux, Mowilex, Propan
5	Pelapis Lantai	:	R. Publik, Koridor, unit Hunian,Tangga :HT Polished & Unpolished 60x60 : Roman Granit, Sun Power, Sandimas, Milan, IKAD Toilet, Tempat Cuci, Ruang Wudhu :Roman, Sun Power, Sandimas, Milan, Ikad Teras Luar : Roman, Sun Power, Sandimas, Milan, Ikad
6	Kusen	:	Alumunium : Alexindo, Alcoprima, Aluprima, YKK, Indal
7	Daun Pintu	:	Engineering door : Seijin, Lestari Abadi Door, Pintu Kita, Prospero
8	Daun Jendela	:	Alumunium : Alexindo, Alcoprima, Aluprima, YKK, Indal
9	Sanitari	:	Wastafel : Triliunware,American Standard, Toto, Kloset Duduk : Triliunware,American Standard, Toto, Kloset Jongkok : Triliunware,American Standard, Toto, Kran Shower: Triliunware,American Standard, Toto, San Ei Jet Spray : Triliunware,American Standard, Toto, San Ei Kran Cuci :Triliunware,American Standard, Toto, San Ei Floor Drain : Triliunware,American Standard, Toto, San Ei

LAPORAN PROGRES PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

MINGGU KE - 35

PERIODE : 7 S/D 13 Agustus 2026

DATA PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



B. DATA PELAKSANAAN

BAPLK/SPL	BASTLK.18/Bp13.6.2/PK/XII/2025	15 Desember 2025
PCM	BARPPK.15/Bp13.6.2/PK/XII/2025	12 Desember 2025
MC0	BAMC0.24/Bp13.6.2/PK/XII/2025	17 Desember 2025
SPMK	SPMK.16/Bp13.6.2/PK/XII/2025	12 Desember 2025
Waktu Pelaksanaan		300 Hari Kalender
Waktu Terpakai		245 Hari Kalender
Sisa Waktu		55 Hari Kalender

PROGRES FISIK MINGGU KE-35

STATUS Minggu 35 (2026)

Rencana	83,429%
Realisasi	95,980%
Deviasi	12,551%

PROGRES YANG AKAN DICAPAI MINGGU SELANJUTNYA

Rencana	2,335%
Kumulatif	85,764%

RENCANA SERAH TERIMA

Serah Terima I (PHO)	Tgl
Serah Terima Kelola	Tgl
Serah Terima II (FHO)	Tgl

STATUS PBG

STATUS SLF	
------------	--

CATATAN PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



Hasil Tindak Lanjut Permasalahan Minggu Lalu

Permasalahan Minggu ini	Rencana Tindak Lanjut

CATATAN PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)

Pekerjaan Minggu ini	Rencana Pekerjaan Minggu depan
1. Pekerjaan elektrik, plumbing dan mekanikal 2. Pekerjaan Pengecatan dinding 3. Pekerjaan pasang kusen dan daun jendela 4. Pekerjaan kisi-kisi jendela 5. Pekerjaan pasang keramik 30/30 selasar 6. Pasang ACP area tampak depan & belakang bangunan 7. Pekerjaan pembersihan area dalam & luar gedung 8. Pekerjaan pasang sanitair 9. Pekerjaan Saluran Drainase U-ditch 40 x 60 Insitu Jalan Paving Ke depan 10. Pekerjaan fire alarm 11. Pekerjaan CCTV	- Pekerjaan cat penutup - Pekerjaan MEP - Pekerjaan kusen - Pekerjaan ACP - Pasang lampu, stopkontak, saklar - Pekerjaan saluran drainase

Catatan Pelaksanaan

1. Supaya tetap memperhatikan persyaratan teknis yang berlaku dan K3
2. Tetap tertib administrasi

KETERSEDIAAN MATERIAL, ALAT, DAN TENAGA KERJA

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



KETERSEDIAAN MATERIAL

- kusen dan aksesoris
- sanitair
- kitchen zink
- panel listrik
- Armatuur lampu

KETERSEDIAAN MATERIAL, ALAT, DAN TENAGA KERJA

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)

KETERSEDIAAN PEKERJA

Management Project

1. Project Manager : 1 Org
2. Petugas K3 : 1 Org
3. Logistik : 1 Org
4. Drafter : 1 Org
5. Administrasi : 1 Org
6. Surveyor : 2 Org
7. Pelaksana Sipil & Ars : 2 Org
8. Pelaksana MEP : 1 Org
- JUMLAH : 10 Orang

Tenaga Kerja

1. Mandor : 2 Org
2. House keeping : 7 Org
3. Kepala Tukang : 1 Org
4. Tukang batu : 2 Org
5. Tukang keramik : 9 Org
6. Tukang kusen : 4 Org
7. Tukang plafond : 5 Org
8. Tukang MEP AC : 5 Org
9. Tukang MEP : 8 Org
10. Tukang cat : 11 Org
11. Tukang besi : 2 Org
12. Tukang kayu : 4 Org
13. Operator alat berat : 1 Org
14. Tukang ACP : 5 Org
- JUMLAH : 60 Orang

KETERSEDIAAN ALAT

ALAT	VOLUME	SATUAN
Excavator PC50	1	unit

REKAP CUACA


PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



LAPORAN CUACA											
NO.	PERIODE	MINGGU KE - 35			AGST		7 -13		/2026	KETERANGAN	
	TANGGAL	7	8	9	10	11	12	13			
	WAKTU										
1	07.00-08.00									PAGI	
2	08.00-09.00										
3	09.00-10.00										
4	10.00-11.00										
5	11.00-12.00										
6	12.00-13.00									SIANG	
7	13.00-14.00										
8	14.00-15.00										
9	15.00-16.00										
10	16.00-17.00										
11	17.00-18.00									MALAM	
12	18.00-19.00										
13	19.00-20.00										
14	20.00-21.00										
15	21.00-22.00										
CATATAN :										KETERANGAN :	
	CERAH	67	JAM								CERAH
	MENDUNG	38	JAM								MENDUNG
	GERIMIS	0	JAM								GERIMIS
	HUJAN	0	JAM								HUJAN

KURVA-S

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)

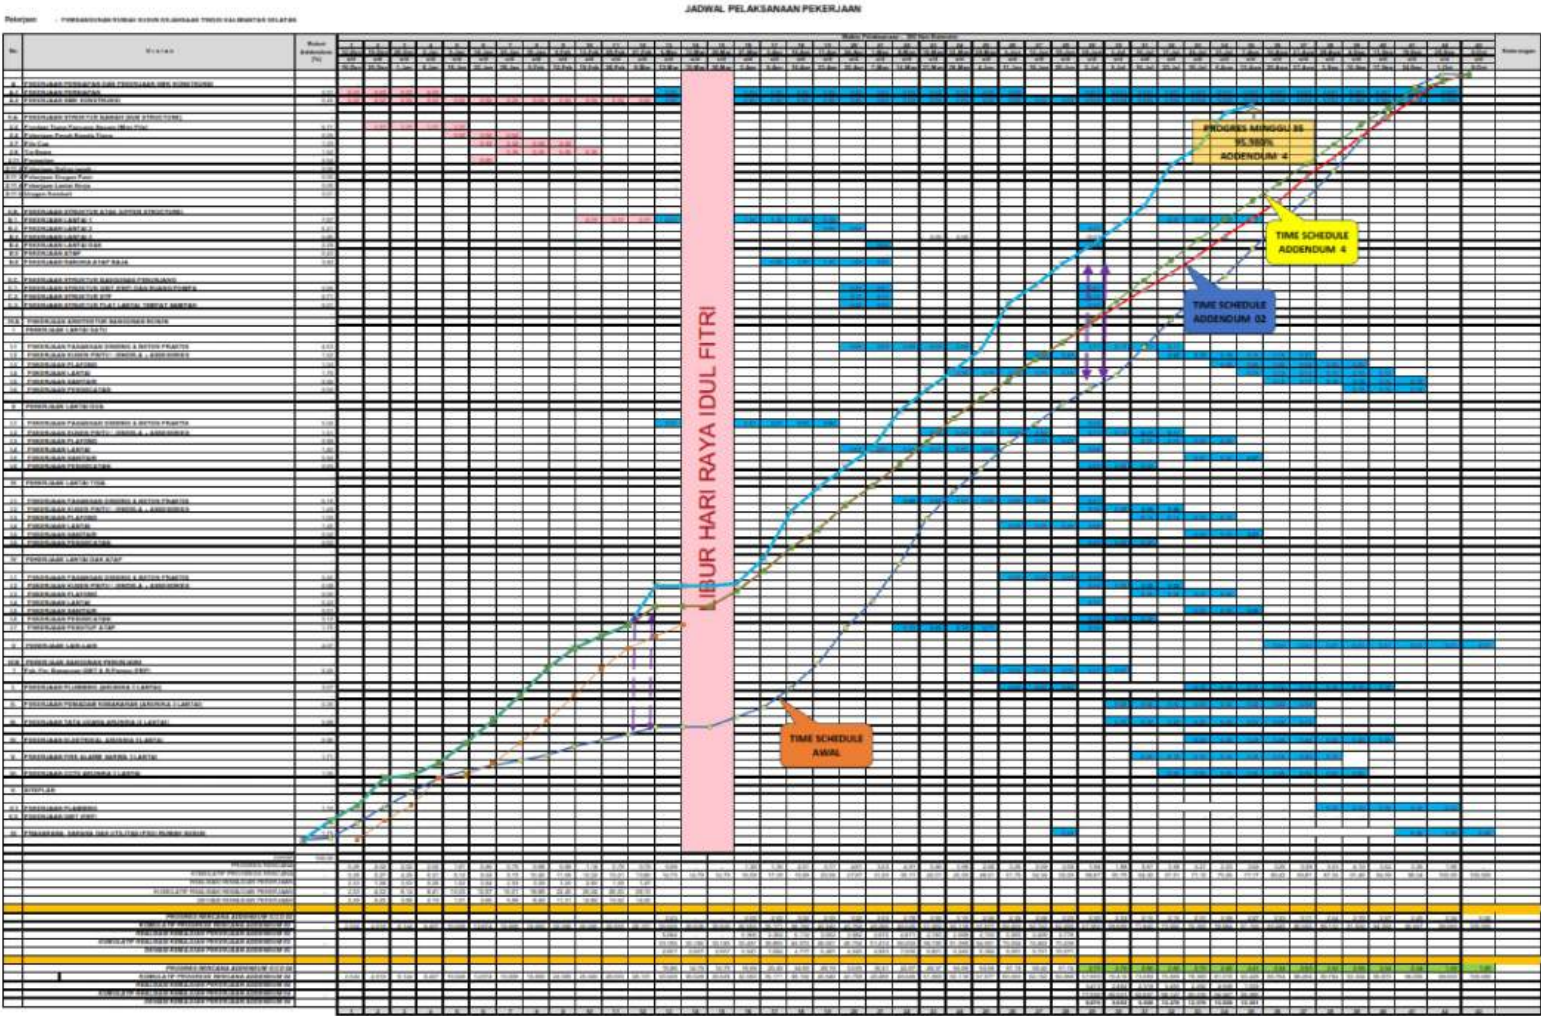

Manajemen :
Regulator Pembangun Koordinasi
RUMAH SUSUN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Disiapkan oleh :
Regulator Manajemen Rancangan
PT LUMAS SURABAYA KINO PT CITRA VISIA PERKOTA

Disiapkan oleh :
Regulator Perumahan
PT LUMAS SURABAYA KINO PT CITRA VISIA PERKOTA

DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



Pekerjaan cat



Pekerjaan cat



Pekerjaan cat



Pekerjaan cat



Pekerjaan cat



Pekerjaan cat



Pekerjaan cat

*catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai

DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



Pekerjaan facade



Pekerjaan facade



Pekerjaan facade



Pekerjaan facade



Pekerjaan facade



Pekerjaan facade



Pekerjaan facade



Pekerjaan facade

*catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai

DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



Rapat koordinasi



Rapat koordinasi




Kunjungan lapangan



Cover space tangga



Cover space tangga

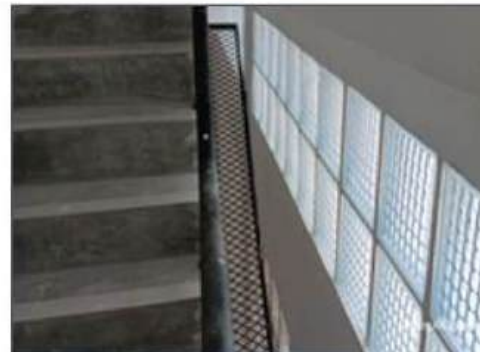

Cover space tangga



Pekerjaan sanitair

*catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai

DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



Pekerjaan meja dapur



Pekerjaan meja dapur



Pekerjaan cat/ keramik



Pekerjaan cat/ keramik

**catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai*

DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



Pekerjaan tempat wudhu



Pekerjaan tempat wudhu




Pekerjaan meja dapur




Pekerjaan meja dapur



Pekerjaan elektrik

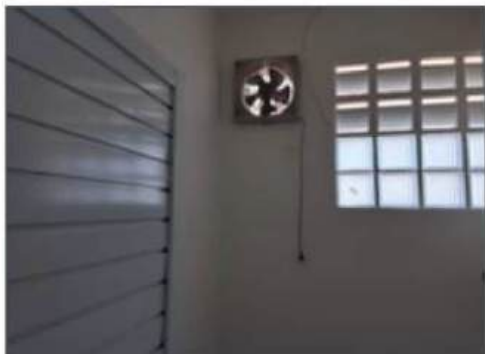

Pekerjaan elektrik

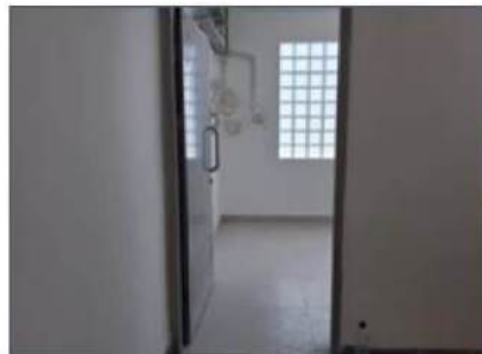

Pekerjaan elektrik



Pekerjaan elektrik

*catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai

DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



Pekerjaan kusen



Pekerjaan kusen




Pekerjaan kusen




Pekerjaan kusen




Pekerjaan kusen

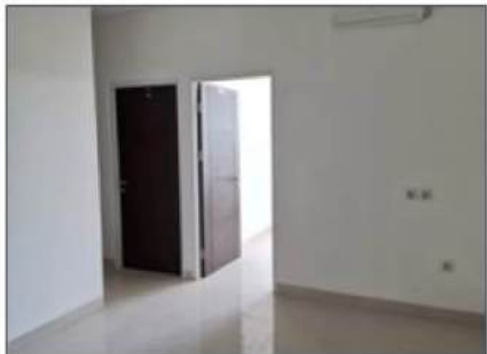

Pekerjaan kusen

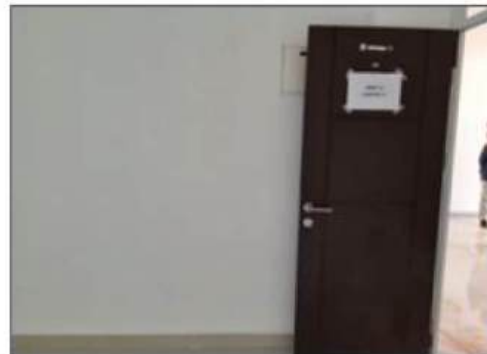

Pekerjaan kusen

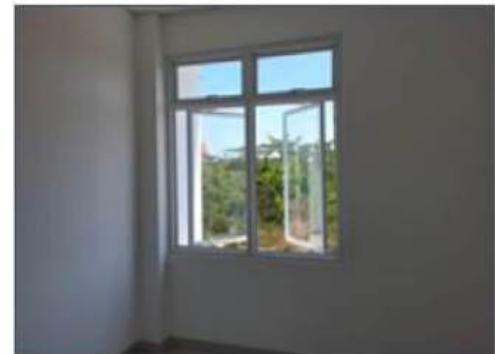

Pekerjaan kusen

*catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai

DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



Pekerjaan out door AC



Pekerjaan out door AC



Pekerjaan indoor AC



Pekerjaan indoor AC



Pekerjaan pompa



Pekerjaan pompa



Pekerjaan sanitair



Pekerjaan sanitair

*catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai

DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



Pekerjaan out door AC



Pekerjaan out door AC



Pekerjaan indoor AC



Pekerjaan indoor AC




Pekerjaan elektrik



Pekerjaan elektrik



Pekerjaan elektrik



Pekerjaan elektrik

*catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai

DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



Slump test beton saluran



Slump test beton saluran



Slump test beton saluran



Pekerjaan beton



Pekerjaan saluran



Pekerjaan saluran

*catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai

GAMBAR

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



**catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai*

GAMBAR

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



**catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai*

GAMBAR

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



**catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai*

**FORM LAPORAN K3
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN
SELATAN (MYC 2025- 2026)**

Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan

Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan

ISIRI / TANGGAL

Jumat 07/08/2026

s/d Kamis 13/08/2026

LAPORAN MINGGU

35

NO	LOKASI / LOKASI	HARI / TANGGAL	TEMUAN AWAL	RENCANA PERBAIKAN	PERRAIKAN YANG DIARURUKAN	FOTO SEBELUM PERBAIKAN	FOTO SETELAH PERBAIKAN
1	Rutan Keagamaan Tinggi Kalsel pada Halaman Depan	Jumat 07/08/2026	Sampah kor di rumah belum diangkut	segera diangkut	segera diangkut		
2	Rutan Keagamaan Tinggi Kalsel pada Samping Sulatan	Sabtu 08/08/2026	Sekuran Drainase maka diangkut yang diangkut akan dalam koordinasi sampah maka belum diangkut	segera diangkut	Akan segera diangkut		
3	Rutan Keagamaan Tinggi Kalsel pada Samping Halaman Gedung	Kamis 09/08/2026	Sampah kor di rumah belum diangkut	segera diangkut	Diangkut untuk diangkut		
4	Rutan Keagamaan Tinggi Kalsel pada Samping Depan	Jumat 10/08/2026	Kabel listrik yang diangkut akan diangkut	segera diangkut perbaikan area	Diangkut untuk diangkut		
5	Rutan Keagamaan Tinggi Kalsel di Lantai 12 L1 1	Sabtu 11/08/2026	Pekerjaan beban tidak boleh diangkut	segera diangkut agar tidak terjadi insiden	segera diangkut		
6	Rutan Keagamaan Tinggi Kalsel pada akses Depan	Kamis 12/08/2026	Kabel listrik yang diangkut pada akses pekerja sangat berbahaya	segera diangkut	Diangkut untuk diangkut		
7	Rutan Keagamaan Tinggi Kalsel pada Samping Samping	Kamis 13/08/2026	Sekuran Drainase maka diangkut sampah	segera untuk diangkut	Diangkut untuk diangkut		

DISTRIBUSI

Keagamaan Tinggi Kalsel

DISTRIBUSI

Keagamaan Tinggi Kalsel

DISTRIBUSI

Keagamaan Tinggi Kalsel

KELOMPOK 1-4-17

NAMA 63-Keagamaan Tinggi Kalsel

LAPORAN APD MINGGUAN

K6 Formulir Lembar Periksa Persediaan APD

Lembar Periksa Persediaan APD

HARI / TANGGAL : Kamis,13 Agustus 2026

LAPORAN MINGGU KE- 35

No.	Jenis APD	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Buruk	
1.	Pelindung Mata / Safety Goggles	6	√		
2.	Sepatu Keselamatan / Safety Boot	-	-		
3.	Topi Keselamatan / Safety Helmet	12	√		
4.	Sarung Tangan / Safety Hand Gloves	10	√		
5.	Pelindung Telinga / Safety Ear Plug	-	-		
6.	Rompi Keselamatan / Safety Vest	14	√		
7.	Tameng Muka / Face Shield	-	-		
8.	Kap Las / Welding Cap	-	-		
9.	Alat Pemadam Api Ringan / Fire Extinguisher	2	√		
10.	P 3 K / First Aid Kit	1	√		
11.	Tandu / Stretcher	1	√		

Disetujui Oleh:

Diobservasi Oleh:

KODE FORMULIR F-K3-06

NAMA FORM K6 Formulir Lembar Periksa Persediaan APD



LAPORAN PATROLI KESELAMATAN (Safety Patrol)

K-4 Lembar Periksa Patroli Keselamatan (Safety Patrol)

Patroli Keselamatan (Safety Patrol)

HARI / TANGGAL : Rabu, 12 Agustus 2026

LAPORAN MINGGU KE- 35

No.	Item yang akan Di inspeksi	Jumlah	Baik	Tidak	Keterangan
1.	Alat Pelindung Diri (APD)				
	1. Pelindung Mata / Safety Goggles	6	✓		
	2. Sepatu Keselamatan / Safety Boot	15	✓		
	3. Topi Keselamatan / Safety Helmet	15	✓		
	4. Sarung Tangan / Safety Hand Gloves	10	✓		
	5. Pelindung Telinga / Safety Ear Plug	-	-		
	6. Pelindung Pernafasan / Masks	5	✓		
	7. Rompi Keselamatan / Safety Vest	15	✓		
	8. Kap Las / Welding Cap	-	-		
2.	Alat Pemadam Api	2	✓		
3.	P3K / First Aid Kit	1	✓		
4.	Tandu / Stcher	1	✓		

Hal-hal lain yang berbahaya (fasilitas atau perilaku pekerja):

Sampah sisa konstruksi segera diangkut dari lokasi pekerjaan

Segera dibersihkan ruangan yang sudah selesai pekerjaannya

APD Pekerja harus selalu dipakai

Disetujui Oleh:



Diobservasi Oleh:



KODE FORMULIR

F-K3 04

NAMA FORMULIR

K-4 Lembar Periksa Patroli Keselamatan (Safety Patrol)



LAPORAN KOTAK P3K

K2-Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

LAPORAN KOTAK P3K MINGGUAN

HARI / TANGGAL : Sabtu, 08 Agustus 2026

LAPORAN MINGGU KE- 35

No	JENIS ALAT	TEMPAT	JUMLAH	KONDISI		KETERANGAN
				BAIK	RUSAK	
1	KASA STERIL 16X16 TERBUNGKUS	Direksi Keet	10	✓		bh
2	PERBAN (LEBAR 5 CM)	Direksi Keet	10	✓		bh
3	PERBAN (LEBAR 10 CM)	Direksi Keet	5	✓		bh
4	PLESTER (LEBAR 1,25 CM)	Direksi Keet	1	✓		bh
5	PLESTER CEPAT/OKEPLAST	Direksi Keet	1	✓		pax
6	BETADIN	Direksi Keet	1	✓		bh
7	KAIN SEGITIGA MITTELA	Direksi Keet	1	✓		pax
8	REVANOL	Direksi Keet	1	✓		bh
9	ALCOHOL ONE SWAB	Direksi Keet	1	✓		pax
10	SARUNG TANGAN SEKALI PAKAI (PASANGAN)	Direksi Keet	4	✓		bh
11	MASKER	Direksi Keet	3	✓		pax
12	TABUNG OKSIGEN	Direksi Keet	1	✓		bh
13	MINYAK KAYU PUTIH	Direksi Keet	1	✓		bh
14	OBAT PARASETAMOL	Direksi Keet	10	✓		bgi
15	GUNTING	Direksi Keet	-	-		

DISETUJUI OLEH
Koordinator Pengawas Lapangan



DIPERIKSA OLEH
Konsultan Supervisi



DILAPORKAN OLEH
Ranuwadi Jaya



KODE FF-K3-02

NAMA K2-Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)



LAPORAN KEGIATAN K3 LAINNYA

MATRIKS CEKLIST PELAKSANAAN SMK DI LAPORAN MINGGUAN PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KE JAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025 -2026) LAPORAN MINGGU KE- 35					
No	Uraian Laporan Mingguan	Kode Form	Ada	Tidak	Keterangan
1	Rangkuman Capaian Pekerjaan Mingguan				Berupa hasil perbandingan capaian pekerjaan dengan minggu sebelumnya, capaian minggu berjalan, serta rencana kegiatan dan target minggu berikutnya.
1.1	Form Progress Laporan Mingguan	K-0	☒	☐	Form disesuaikan dengan format masing-masing
2	Hambatan & Kendala Mingguan				Uraian hambatan dalam 1 minggu, langkah penanganan, dan potensi kendala berikutnya.
2.1	Form Perubahan Lapangan	K-A1	☐	☐	Form disesuaikan dengan format masing-masing
2.2	Form Ketidaksesuaian (NCR)	K-A2	☐	☐	Form disesuaikan dengan format masing-masing
2.3	Form Peralatan Ditagging	K-A3	☐	☐	Form disesuaikan dengan format masing-masing
2.4	Form Analisis Keselamatan Konstruksi (JSA/HIRA)	K-A4	☒	☐	Form disesuaikan dengan format masing-masing
3	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan				Dukungan dari Pimpinan Unit, Penanggung Jawab, Konsultan Pengawas, dan pihak terkait.
3.1	Form Daftar Hadir Induksi (SHE Induction)	K5	☒	☐	Form disesuaikan dengan format masing-masing
3.2	Form Daftar Hadir Toolbox Meeting Mingguan	K7	☒	☐	Form disesuaikan dengan format masing-masing
3.3	Form Patroli Keselamatan	K4	☒	☐	Form disesuaikan dengan format masing-masing
4	Permohonan Persetujuan Dokumen				Permohonan Persetujuan Dokumen
4.1	Form Persetujuan Harian Mingguan	K-P1	☐	☐	Form disesuaikan dengan format masing-masing
4.2	Form Permintaan Pengujian	K-P2	☒	☐	Form disesuaikan dengan format masing-masing
5	Pemeriksaan & Pengujian				Pemeriksaan & Pengujian
5.1	Form Pemeriksaan Alat Mingguan	K-I1	☐	☐	Form disesuaikan dengan format masing-masing
5.2	Form Pengujian Lapangan	K-I2	☒	☐	Form disesuaikan dengan format masing-masing
6	Keselamatan Konstruksi (K3)				Keselamatan Konstruksi (K3)
6.1	Inspeksi Keselamatan Mingguan	K1	☒	☐	
6.2	Rekap Kotak P3K	K2	☒	☐	
6.3	Form Pemeriksaan APAR Mingguan	K3	☒	☐	
6.4	Form Persediaan APD	K6	☒	☐	



MONITORING PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)

MONITORING IPL

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



Pekerjaan : Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
Lokasi : Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Pelaksana : PT. Surya Mega Jaya
Tanggal Kontrak Pelaksanaan : 12 Desember 2025
Waktu Pelaksanaan : 300 Hari Kalender
Manajemen Konstruksi : PT. Laras Sembada KSO PT. Citra Yasa Persada

No.	Nomor Dokumen	Deskripsi	Tanggal Pengajuan	Submital ke :	Manajemen Konstruksi			Keterangan
					Masuk	Keluar	Durasi	
	14/IPL/SMJ/STR/I/2026	Ijin Pelaksanaan Pasang Begisting Balok & Plat Lantai 2	20 Januari 2026				1	
	021/PT.SMJ/RK/JI/I/2026	Surat Undangan Joint Inspection	22 Januari 2026		22/01/2026	26/01/2026	5	
	/SMJ.IP/RUSUN.KEJATI/I/2026	Ijin Pengecoran Kolom lt. 1	22 Januari 2026		22/01/2026	26/01/2026	5	Rencana Cor tgl. 23
	/SMJ.IP/RUSUN.KEJATI/I/2026	Ijin Pengecoran Kolom Lantai 1	23 Januari 2026		23/01/2026	26/01/2026	4	Rencana Cor tgl. 24
	/SMJ.IP/RUSUN.KEJATI/I/2026	Ijin Pengecoran Balok & Plat Lantai 2	26 Januari 2026		26/01/2026	26/01/2026	1	Rencana Cor tgl. 27

*catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)



Pekerjaan : Pembangunan Rumah Susun Kejaksaa Tinggi Kalimantan Selatan
Lokasi : Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Pelaksana : PT. Surya Mega Jaya
Tanggal Kontrak Pelaksanaan : 12 Desember 2025
Waktu Pelaksanaan : 300 Hari Kalender
Manajemen Konstruksi : PT. Laras Sembada KSO PT. Citra Yasa Persada

[illegible]

*catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025- 2026)

[illegible][illegible]

*catt: dokumentasi setiap item pekerjaan per lantai



TERIMA KASIH

LAMPIRAN RINCIAN LAPORAN PROGRES MINGGUAN:

- REKAP PROGRES MINGGUAN**
- RINCIAN PROGRES MINGGUAN**

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
 TYPE PROTOTYPE : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN TYPE ARUNIKA
 MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)
 PERIODE : 7 S/D 13 AGUSTUS 2026

NO	JENIS PEKERJAAN	BOBOT ADD 2 (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			VOLUME	PRESTASI	BOBOT	PRESTASI	BOBOT	PRESTASI	BOBOT
				%	%	%	%	%	%
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN								
IA	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,912		99,34	0,91		0,00	99,51	0,91
IB	PEKERJAAN SMK KONSTRUKSI	0,451		87,61	0,39	-	-	87,61	0,39
		-		-	-	-	-	-	-
II	PEKERJAAN STRUKTUR								
II.A	STRUKTUR BAWAH	10,259		100,00	10,26	-	-	100,00	10,26
II.B	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS (UPPER STRUCTURE)	-		-	-	-	-	-	-
B.1	PEKERJAAN LANTAI 1	7,674		100,00	7,67	-	-	100,00	7,67
B.2	PEKERJAAN LANTAI 2	6,213		100,00	6,21	-	-	100,00	6,21
B.3	PEKERJAAN LANTAI 3	5,851		100,00	5,85	-	-	100,00	5,85
B.4	PEKERJAAN LANTAI DAK	2,287		100,00	2,29	-	-	100,00	2,29
B.5	PEKERJAAN ATAP	0,433		100,00	0,43	-	-	100,00	0,43
B.6	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA	3,827		100,00	3,83	-	-	100,00	3,83
		-		-	-	-	-	-	-
II.C	PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN PENUNJANG								
C.1	PEKERJAAN STRUKTUR GWT DAN RUANG POMPA	0,659		100,00	0,66	-	-	100,00	0,66
C.2	PEKERJAAN STRUKTUR STP	0,715		100,00	0,71	-	-	100,00	0,71
C.3	PEKERJAAN STRUKTUR PLAT LANTAI TEMPAT SAMPAH	0,012		100,00	0,01	-	-	100,00	0,01
		-		-	-	-	-	-	-
III.A	PEKERJAAN ARSITEKTUR BANGUNAN RUSUN								
I	PEKERJAAN LANTAI SATU	-		-	-	-	-	-	-
II.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & BETON PRAKTIS	4,529		100,00	4,53	-	-	100,00	4,53
II.2	PEKERJAAN KUSEN PINTU / JENDELA + ASSESORIES	1,619		100,00	1,62	-	-	100,00	1,62
II.3	PEKERJAAN PLAFOND	1,028		100,00	1,03	-	-	100,00	1,03
II.4	PEKERJAAN LANTAI	1,700		99,49	1,69	0,51	0,01	100,00	1,70
II.5	PEKERJAAN SANITAIR	0,921		98,08	0,90	1,21	0,01	99,29	0,91
II.6	PEKERJAAN PENGECATAN	0,594		83,25	0,49	3,35	0,02	86,60	0,51
II	PEKERJAAN LANTAI DUA	-		-	-	-	-	-	-
II.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & BETON PRAKTIS	5,038		100,00	5,04	-	-	100,00	5,04
II.2	PEKERJAAN KUSEN PINTU / JENDELA + ASSESORIES	1,506		99,35	1,50	-	-	99,35	1,50
II.3	PEKERJAAN PLAFOND	0,992		100,00	0,99	-	-	100,00	0,99
II.4	PEKERJAAN LANTAI	1,402		100,00	1,40	-	-	100,00	1,40
II.5	PEKERJAAN SANITAIR	0,925		93,35	0,86	6,02	0,06	99,37	0,92
II.6	PEKERJAAN PENGECATAN	0,625		96,55	0,60	0,69	0,00	97,24	0,61
III	PEKERJAAN LANTAI TIGA	-		-	-	-	-	-	-
III.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & BETON PRAKTIS	5,159		100,00	5,16	-	-	100,00	5,16
III.2	PEKERJAAN KUSEN PINTU / JENDELA + ASSESORIES	1,493		99,34	1,48	-	-	99,34	1,48
III.3	PEKERJAAN PLAFOND	1,026		100,00	1,03	-	-	100,00	1,03
III.4	PEKERJAAN LANTAI	1,254		100,00	1,25	-	-	100,00	1,25
III.5	PEKERJAAN SANITAIR	0,925		80,81	0,75	18,56	0,17	99,37	0,92
III.6	PEKERJAAN PENGECATAN	0,621		96,56	0,60	0,69	0,00	97,25	0,60
IV	PEKERJAAN LANTAI DAK ATAP	-		-	-	-	-	-	-
IV.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & BETON PRAKTIS	0,447		100,00	0,45	-	-	100,00	0,45
IV.2	PEKERJAAN KUSEN PINTU / JENDELA + ASSESORIES	0,078		90,63	0,07	-	-	90,63	0,07
IV.3	PEKERJAAN PLAFOND	0,005		100,00	0,00	-	-	100,00	0,00
IV.4	PEKERJAAN LANTAI	0,232		100,00	0,23	-	-	100,00	0,23
IV.5	PEKERJAAN SANITAIR	0,009		-	-	-	-	-	-
IV.6	PEKERJAAN PENGECATAN	0,124		100,00	0,12	-	-	100,00	0,12
IV.7	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	1,763		100,00	1,76	-	-	100,00	1,76
V	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4,074		83,52	3,40	2,94	0,12	86,45	3,52
		-		-	-	-	-	-	-
III.B	PEKERJAAN BANGUNAN PENUNJANG								
1	Pek. Fin. Bangunan GWT & R.Pompa (FRP)	0,248		100,00	0,25	-	-	100,00	0,25
		-		-	-	-	-	-	-
IV	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLUMBING								
I	PEKERJAAN PLUMBING (ARUNIKA 3 LANTAI)	3,571		98,66	3,52	1,05	0,04	99,72	3,56
II	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (ARUNIKA 3 LANTAI)	0,347		100,00	0,35	-	-	100,00	0,35
III	PEKERJAAN TATA UDARA ARUNIKA (3 LANTAI)	5,876		99,42	5,84	-	-	99,42	5,84
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUNIKA 3 LANTAI	6,963		74,42	5,18	0,83	0,06	75,25	5,24
V	PEKERJAAN FIRE ALARM SARWA 3 LANTAI	1,712		43,76	0,75	11,08	0,19	54,85	0,94
VI	PEKERJAAN CCTV ARUNIKA 3 LANTAI	1,052		68,71	0,72	-	-	68,71	0,72
		-		-	-	-	-	-	-
V	SITEPLAN								
V.1	PEKERJAAN PLAMBING	1,101		100,00	1,10	-	-	100,00	1,10
V.2	PEKERJAAN GWT (FRP)	-		-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-
VI	PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) RUMAH SUSUN								
		1,749		58,74	1,03	20,10	0,35	78,84	1,38
		-		-	-	-	-	-	-
	TOTAL PEKERJAAN	100,00			94,947		1,033		95,980

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS



Banjarbaru, 13 Agustus 2026
 Diajukan Oleh :
 Konsultan Manajemen Konstruksi
 PT. LARAS SEMBADA KSO PT. CITRA YASA PERSADA



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
 TIPE PROTOTYPE : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN TYPE ARUNIKA
 MINGGU KE : 35 (TIGA PULUH LIMA)
 PERIODE : 7 S/D 13 AGUSTUS 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI %	BOBOT %	VOLUME	PRESTASI %	BOBOT %	VOLUME	PRESTASI %	BOBOT %
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
LA	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1		205,46	m'	0,065	205,46	100,00	0,065				205,46	100,00	0,065
2		1,00	bh	0,004	1,00	100,00	0,004	-			1,00	100,00	0,004
3		1,00	ls	0,030	0,80	80,00	0,024	0,0	5,00	0,002	0,85	85,00	0,026
4		192,00	m'	0,315	192,00	100,00	0,315	-			192,00	100,00	0,315
5		6,00	bln	0,120	6,00	100,00	0,120	-			6,00	100,00	0,120
6		6,00	bln	0,180	6,00	100,00	0,180	-			6,00	100,00	0,180
7		27,00	m2	0,197	27,00	100,00	0,197	-			27,00	100,00	0,197
		-		0,912	-		0,906			0,002			0,907
LB	PEKERJAAN SMK KONSTRUKSI												
1		1,00	ls	0,020	1,00	100,00	0,020	-			1,00	100,00	0,020
				-				-					-
				-				-					-
				-				-					-
				-				-					-
2				-				-					-
a		40,00	Org	0,028	40,00	100,00	0,028	-			40,00	100,00	0,028
e		40,00	Org	0,023				-					-
-				-				-					-
-				-				-					-
-				-				-					-
-				-				-					-
j		3,00	bh	0,006	3,00	100,00	0,006	-			3,00	100,00	0,006
				-				-					-
3				-				-					-
				-				-					-
a		801,00	m'	0,024				-					-
b		1,00	ls	0,007	1,00	100,00	0,007	-			1,00	100,00	0,007
c		1,00	ls	0,007				-					-
e		1,00	ls	0,007	1,00	100,00	0,007	-			1,00	100,00	0,007
				-				-					-
				-				-					-
a		75,00	buah	0,255	75,00	100,00	0,255	-			75,00	100,00	0,255
b		10,00	Psg	0,001				-					-
f		250,00	buah	0,005	250,00	100,00	0,005	-			250,00	100,00	0,005
g		150,00	Psg	0,003	150,00	100,00	0,003	-			150,00	100,00	0,003
h		10,00	Psg	0,011	10,00	100,00	0,011	-			10,00	100,00	0,011
k		50,00	buah	0,010	50,00	100,00	0,010	-			50,00	100,00	0,010
l				-				-					-
				-				-					-
4				-				-					-
a		1,00	ls	0,000	1,00	100,00	0,000	-			1,00	100,00	0,000
				-				-					-
5				-				-					-
a			Org	-				-					-
b			Org	-				-					-

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
6				-				-					-
a		1,00	Set	0,022	1,00	100,00	0,022	-			1,00	100,00	0,022
				-				-					-
7				-				-					-
a		3,00	buah	0,002	3,00	100,00	0,002	-			3,00	100,00	0,002
b		5,00	buah	0,004	5,00	100,00	0,004	-			5,00	100,00	0,004
c		5,00	buah	0,004	5,00	100,00	0,004	-			5,00	100,00	0,004
d		3,00	buah	0,002	3,00	100,00	0,002	-			3,00	100,00	0,002
e		1,00	buah	0,001	1,00	100,00	0,001	-			1,00	100,00	0,001
				-				-					-
8				-				-					-
c			Org	-				-					-
				-				-					-
9				-				-					-
a		2,00	buah	0,008	2,00	100,00	0,008	-			2,00	100,00	0,008
				0,451			0,395						0,395
				1,362			1,301			0,002			1,302
II	PEKERJAAN STRUKTUR												
II.A	STRUKTUR BAWAH												
2.2.2		4.001,00	m	6,722	4.001,00	100,00	6,722	-			4.001,00	100,00	6,722
2.2.6		250,00	Unit	0,050	250,00	100,00	0,050	-			250,00	100,00	0,050
2.4.1		250,00	Unit	0,050	250,00	100,00	0,050	-			250,00	100,00	0,050
2.7.1		2,00	Unit	0,009	2,00	100,00	0,009	-			2,00	100,00	0,009
2.7.8		4,00	Unit	0,072	4,00	100,00	0,072	-			4,00	100,00	0,072
2.7.13		38,00	Unit	0,491	38,00	100,00	0,491	-			38,00	100,00	0,491
2.7.3		11,00	Unit	0,206	11,00	100,00	0,206	-			11,00	100,00	0,206
2.7.9		6,00	Unit	0,200	6,00	100,00	0,200	-			6,00	100,00	0,200
2.7.10		2,00	Unit	0,088	2,00	100,00	0,088	-			2,00	100,00	0,088
2.7.11		3,00	Unit	0,166	3,00	100,00	0,166	-			3,00	100,00	0,166
2.8.1		9,10	m	0,018	9,10	100,00	0,018	-			9,10	100,00	0,018
2.8.3		156,97	m	0,594	156,97	100,00	0,594	-			156,97	100,00	0,594
2.8.4		21,25	m	0,097	21,25	100,00	0,097	-			21,25	100,00	0,097
2.8.5		133,19	m	0,520	133,19	100,00	0,520	-			133,19	100,00	0,520
2.8.6		29,95	m	0,152	29,95	100,00	0,152	-			29,95	100,00	0,152
2.8.7		20,99	m	0,136	20,99	100,00	0,136	-			20,99	100,00	0,136
2.11.1		3,00	titik	0,540	3,00	100,00	0,540	-			3,00	100,00	0,540
2.11.2		130,27	m3	0,061	130,27	100,00	0,061	-			130,27	100,00	0,061
2.11.3		21,52	m3	0,025	21,52	100,00	0,025	-			21,52	100,00	0,025
2.11.4		10,84	m3	0,049	10,84	100,00	0,049	-			10,84	100,00	0,049
2.11.5		43,42	m3	0,014	43,42	100,00	0,014	-			43,42	100,00	0,014
				10,259			10,259						10,259
				10,259			10,259						10,259
II.B.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS (UPPER STRUCTURE)												
B.1	PEKERJAAN LANTAI 1												
1		0,89	M3	0,006	0,89	100,00	0,006	-			0,89	100,00	0,006
		230,41	Kg	0,017	230,41	100,00	0,017	-			230,41	100,00	0,017
		10,22	M2	0,008	10,22	100,00	0,008	-			10,22	100,00	0,008
2		-		-				-			-		-
		42,12	M3	0,308	42,12	100,00	0,308	-			42,12	100,00	0,308
		9.521,06	Kg	0,705	9.521,06	100,00	0,705	-			9.521,06	100,00	0,705
		379,08	M2	0,296	379,08	100,00	0,296	-			379,08	100,00	0,296
3		-		-				-			-		-
		6,56	M3	0,048	6,56	100,00	0,048	-			6,56	100,00	0,048
		1.540,61	Kg	0,114	1.540,61	100,00	0,114	-			1.540,61	100,00	0,114
		51,03	M2	0,040	51,03	100,00	0,040	-			51,03	100,00	0,040
4		-		-				-			-		-
		9,11	M3	0,067	9,11	100,00	0,067	-			9,11	100,00	0,067

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
		2.192,00	Kg	0,162	2.192,00	100,00	0,162	-			2.192,00	100,00	0,162
5		60,75	M2	0,047	60,75	100,00	0,047	-			60,75	100,00	0,047
		-			-			-			-		
		138,41	M3	1,011	138,41	100,00	1,011	-			138,41	100,00	1,011
		922,71	M2	1,845	922,71	100,00	1,845	-			922,71	100,00	1,845
		922,71	M2	0,011	922,71	100,00	0,011	-			922,71	100,00	0,011
		276,81	M3	0,360	276,81	100,00	0,360	-			276,81	100,00	0,360
			M2	-				-			-		-
6		922,71	M2	0,289	922,71	100,00	0,289	-			922,71	100,00	0,289
				-				-			-		-
		37,43	M3	0,273	37,43	100,00	0,273	-			37,43	100,00	0,273
		299,46	M2	0,599	299,46	100,00	0,599	-			299,46	100,00	0,599
		299,46	M2	0,004	299,46	100,00	0,004	-			299,46	100,00	0,004
		59,89	M3	0,078	59,89	100,00	0,078	-			59,89	100,00	0,078
		102,38	M2	0,052	102,38	100,00	0,052	-			102,38	100,00	0,052
		3,48	M2	0,004	3,48	100,00	0,004	-			3,48	100,00	0,004
			M2	-				-			-		-
7		299,46	M2	0,094	299,46	100,00	0,094	-			299,46	100,00	0,094
				-				-			-		-
		5,50	M3	0,040	5,50	100,00	0,040	-			5,50	100,00	0,040
		1.133,57	Kg	0,084	1.133,57	100,00	0,084	-			1.133,57	100,00	0,084
8		44,44	M2	0,035	44,44	100,00	0,035	-			44,44	100,00	0,035
				-				-			-		-
		2,89	M3	0,021	2,89	100,00	0,021	-			2,89	100,00	0,021
		208,40	Kg	0,015	208,40	100,00	0,015	-			208,40	100,00	0,015
9		18,36	M2	0,014	18,36	100,00	0,014	-			18,36	100,00	0,014
				-				-			-		-
		1,66	M3	0,012	1,66	100,00	0,012	-			1,66	100,00	0,012
		268,51	Kg	0,020	268,51	100,00	0,020	-			268,51	100,00	0,020
10		11,09	M2	0,009	11,09	100,00	0,009	-			11,09	100,00	0,009
				-				-			-		-
		0,41	M3	0,003	0,41	100,00	0,003	-			0,41	100,00	0,003
		105,28	Kg	0,008	105,28	100,00	0,008	-			105,28	100,00	0,008
11		4,34	M2	0,003	4,34	100,00	0,003	-			4,34	100,00	0,003
				-				-			-		-
		4,10	M3	0,030	4,10	100,00	0,030	-			4,10	100,00	0,030
		839,45	Kg	0,062	839,45	100,00	0,062	-			839,45	100,00	0,062
12		33,11	M2	0,026	33,11	100,00	0,026	-			33,11	100,00	0,026
				-				-			-		-
		2,15	M3	0,016	2,15	100,00	0,016	-			2,15	100,00	0,016
		150,03	Kg	0,011	150,03	100,00	0,011	-			150,03	100,00	0,011
13		13,68	M2	0,011	13,68	100,00	0,011	-			13,68	100,00	0,011
				-				-			-		-
		0,97	M3	0,007	0,97	100,00	0,007	-			0,97	100,00	0,007
		158,48	Kg	0,012	158,48	100,00	0,012	-			158,48	100,00	0,012
14		6,46	M2	0,005	6,46	100,00	0,005	-			6,46	100,00	0,005
				-				-			-		-
		0,30	M3	0,002	0,30	100,00	0,002	-			0,30	100,00	0,002
		57,85	Kg	0,004	57,85	100,00	0,004	-			57,85	100,00	0,004
15		3,23	M2	0,003	3,23	100,00	0,003	-			3,23	100,00	0,003
				-				-			-		-
		3,00	M3	0,022	3,00	100,00	0,022	-			3,00	100,00	0,022
		1.148,96	Kg	0,085	1.148,96	100,00	0,085	-			1.148,96	100,00	0,085
16		55,77	M2	0,044	55,77	100,00	0,044	-			55,77	100,00	0,044
				-				-			-		-
		5,22	M3	0,038	5,22	100,00	0,038	-			5,22	100,00	0,038
		1.029,51	Kg	0,076	1.029,51	100,00	0,076	-			1.029,51	100,00	0,076
17		55,68	M2	0,044	55,68	100,00	0,044	-			55,68	100,00	0,044
				-				-			-		-

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
		11,58	M3	0,085	11,58	100,00	0,085	-			11,58	100,00	0,085
		1.917,79	Kg	0,142	1.917,79	100,00	0,142	-			1.917,79	100,00	0,142
		92,67	M2	0,062	92,67	100,00	0,062	-			92,67	100,00	0,062
18		106,85	m2	0,116	106,85	100,00	0,116	-			106,85	100,00	0,116
19		106,85	m2	0,037	106,85	100,00	0,037	-			106,85	100,00	0,037
20				-				-			-		-
a				-				-			-		-
			M3	-				-			-		-
			Kg	-				-			-		-
			M2	-				-			-		-
b				-				-			-		-
		1,81	M3	0,008	1,81	100,00	0,008	-			1,81	100,00	0,008
		156,00	Kg	0,012	156,00	100,00	0,012	-			156,00	100,00	0,012
		18,10	M2	0,014	18,10	100,00	0,014	-			18,10	100,00	0,014
				7,674			7,674						7,674
B.2	PEKERJAAN LANTAI 2												
1		37,44	M3	0,273	37,44	100,00	0,273	-			37,44	100,00	0,273
		6.452,58	Kg	0,478	6.452,58	100,00	0,478	-			6.452,58	100,00	0,478
		336,96	M2	0,263	336,96	100,00	0,263	-			336,96	100,00	0,263
2				-				-			-		-
		5,83	M3	0,043	5,83	100,00	0,043	-			5,83	100,00	0,043
		1.043,88	Kg	0,077	1.043,88	100,00	0,077	-			1.043,88	100,00	0,077
		45,36	M2	0,035	45,36	100,00	0,035	-			45,36	100,00	0,035
3				-				-			-		-
		8,10	M3	0,059	8,10	100,00	0,059	-			8,10	100,00	0,059
		1.519,08	Kg	0,112	1.519,08	100,00	0,112	-			1.519,08	100,00	0,112
		54,00	M2	0,042	54,00	100,00	0,042	-			54,00	100,00	0,042
4				-				-			-		-
		0,54	M3	0,004	0,54	100,00	0,004	-			0,54	100,00	0,004
		104,38	Kg	0,008	104,38	100,00	0,008	-			104,38	100,00	0,008
		9,36	M2	0,007	9,36	100,00	0,007	-			9,36	100,00	0,007
5				-				-			-		-
		9,78	M3	0,071	9,78	100,00	0,071	-			9,78	100,00	0,071
		1.817,67	Kg	0,135	1.817,67	100,00	0,135	-			1.817,67	100,00	0,135
		78,23	M2	0,063	78,23	100,00	0,063	-			78,23	100,00	0,063
6				-				-			-		-
		2,38	M3	0,017	2,38	100,00	0,017	-			2,38	100,00	0,017
		424,94	Kg	0,031	424,94	100,00	0,031	-			424,94	100,00	0,031
		20,07	M2	0,016	20,07	100,00	0,016	-			20,07	100,00	0,016
7				-				-			-		-
		1,77	M3	0,013	1,77	100,00	0,013	-			1,77	100,00	0,013
		484,09	Kg	0,036	484,09	100,00	0,036	-			484,09	100,00	0,036
		16,31	M2	0,013	16,31	100,00	0,013	-			16,31	100,00	0,013
8				-				-			-		-
		22,13	M3	0,162	22,13	100,00	0,162	-			22,13	100,00	0,162
		3.335,52	Kg	0,247	3.335,52	100,00	0,247	-			3.335,52	100,00	0,247
		187,59	M2	0,151	187,59	100,00	0,151	-			187,59	100,00	0,151
9				-				-			-		-
		0,95	M3	0,007	0,95	100,00	0,007	-			0,95	100,00	0,007
		143,26	Kg	0,011	143,26	100,00	0,011	-			143,26	100,00	0,011
		8,55	M2	0,007	8,55	100,00	0,007	-			8,55	100,00	0,007
10				-				-			-		-
		2,52	M3	0,018	2,52	100,00	0,018	-			2,52	100,00	0,018
		572,37	Kg	0,042	572,37	100,00	0,042	-			572,37	100,00	0,042
		18,64	M2	0,015	18,64	100,00	0,015	-			18,64	100,00	0,015
11				-				-			-		-
		21,05	M3	0,154	21,05	100,00	0,154	-			21,05	100,00	0,154
		3.091,91	Kg	0,229	3.091,91	100,00	0,229	-			3.091,91	100,00	0,229

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
12		148,19	M2	0,119	148,19	100,00	0,119	-			148,19	100,00	0,119
		-		-	-			-			-		-
		3,83	M3	0,028	3,83	100,00	0,028	-			3,83	100,00	0,028
		684,94	Kg	0,051	684,94	100,00	0,051	-			684,94	100,00	0,051
		26,68	M2	0,021	26,68	100,00	0,021	-			26,68	100,00	0,021
		-		-	-			-			-		-
13		3,04	M3	0,022	3,04	100,00	0,022	-			3,04	100,00	0,022
		846,40	Kg	0,063	846,40	100,00	0,063	-			846,40	100,00	0,063
		15,75	M2	0,013	15,75	100,00	0,013	-			15,75	100,00	0,013
14		-		-	-			-			-		-
		5,57	M3	0,041	5,57	100,00	0,041	-			5,57	100,00	0,041
		1.241,53	Kg	0,092	1.241,53	100,00	0,092	-			1.241,53	100,00	0,092
		30,66	M2	0,025	30,66	100,00	0,025	-			30,66	100,00	0,025
		-		-	-			-			-		-
		89,36	M3	0,653	89,36	100,00	0,653	-			89,36	100,00	0,653
		11.142,20	Kg	0,825	11.142,20	100,00	0,825	-			11.142,20	100,00	0,825
		714,88	M2	0,574	714,88	100,00	0,574	-			714,88	100,00	0,574
16		-		-	-			-			-		-
		1,85	M3	0,014	1,85	100,00	0,014	-			1,85	100,00	0,014
		380,19	Kg	0,028	380,19	100,00	0,028	-			380,19	100,00	0,028
		20,86	M2	0,018	20,86	100,00	0,018	-			20,86	100,00	0,018
		-		-	-			-			-		-
		3,00	M3	0,022	3,00	100,00	0,022	-			3,00	100,00	0,022
		1.148,96	Kg	0,085	1.148,96	100,00	0,085	-			1.148,96	100,00	0,085
		55,77	M2	0,048	55,77	100,00	0,048	-			55,77	100,00	0,048
18		-		-	-			-			-		-
		5,22	M3	0,039	5,22	100,00	0,039	-			5,22	100,00	0,039
		1.029,51	Kg	0,076	1.029,51	100,00	0,076	-			1.029,51	100,00	0,076
		55,68	M2	0,048	55,68	100,00	0,048	-			55,68	100,00	0,048
		-		-	-			-			-		-
		5,16	M3	0,038	5,16	100,00	0,038	-			5,16	100,00	0,038
19		1.047,22	Kg	0,078	1.047,22	100,00	0,078	-			1.047,22	100,00	0,078
		22,32	M2	0,019	22,32	100,00	0,019	-			22,32	100,00	0,019
		-		-	-			-			-		-
20		2,89	M3	0,021	2,89	100,00	0,021	-			2,89	100,00	0,021
		208,40	Kg	0,015	208,40	100,00	0,015	-			208,40	100,00	0,015
		18,36	M2	0,016	18,36	100,00	0,016	-			18,36	100,00	0,016
21		-		-	-			-			-		-
		1,66	M3	0,012	1,66	100,00	0,012	-			1,66	100,00	0,012
		268,51	Kg	0,020	268,51	100,00	0,020	-			268,51	100,00	0,020
		11,09	M2	0,010	11,09	100,00	0,010	-			11,09	100,00	0,010
		-		-	-			-			-		-
		0,41	M3	0,003	0,41	100,00	0,003	-			0,41	100,00	0,003
22		105,28	Kg	0,008	105,28	100,00	0,008	-			105,28	100,00	0,008
		4,34	M2	0,004	4,34	100,00	0,004	-			4,34	100,00	0,004
		-		-	-			-			-		-
23		3,84	M3	0,028	3,84	100,00	0,028	-			3,84	100,00	0,028
		775,11	Kg	0,057	775,11	100,00	0,057	-			775,11	100,00	0,057
		30,75	M2	0,026	30,75	100,00	0,026	-			30,75	100,00	0,026
24		-		-	-			-			-		-
		2,15	M3	0,016	2,15	100,00	0,016	-			2,15	100,00	0,016
		150,03	Kg	0,011	150,03	100,00	0,011	-			150,03	100,00	0,011
		13,68	M2	0,012	13,68	100,00	0,012	-			13,68	100,00	0,012
		-		-	-			-			-		-
		0,97	M3	0,007	0,97	100,00	0,007	-			0,97	100,00	0,007
25		158,48	Kg	0,012	158,48	100,00	0,012	-			158,48	100,00	0,012
		6,46	M2	0,006	6,46	100,00	0,006	-			6,46	100,00	0,006
		-		-	-			-			-		-
26		0,30	M3	0,002	0,30	100,00	0,002	-			0,30	100,00	0,002
		57,85	Kg	0,004	57,85	100,00	0,004	-			57,85	100,00	0,004

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
27		3,23	M2	0,003	3,23	100,00	0,003	-			3,23	100,00	0,003
a		-		-				-			-		-
		-		-				-			-		-
			M3	-				-			-		-
			Kg	-				-			-		-
b			M2	-				-			-		-
		-		-				-			-		-
		2,41	M3	0,011	2,41	100,00	0,011	-			2,41	100,00	0,011
		208,00	Kg	0,015	208,00	100,00	0,015	-			208,00	100,00	0,015
		24,13	M2	0,019	24,13	100,00	0,019	-			24,13	100,00	0,019
				6,213			6,213						6,213
B.3	PEKERJAAN LANTAI 3												
1													
		46,08	M3	0,337	46,08	100,00	0,337	-			46,08	100,00	0,337
		8.099,14	Kg	0,599	8.099,14	100,00	0,599	-			8.099,14	100,00	0,599
		414,72	M2	0,324	414,72	100,00	0,324	-			414,72	100,00	0,324
2		-		-				-			-		-
		0,54	M3	0,004	0,54	100,00	0,004	-			0,54	100,00	0,004
		105,88	Kg	0,008	105,88	100,00	0,008	-			105,88	100,00	0,008
		9,36	M2	0,007	9,36	100,00	0,007	-			9,36	100,00	0,007
3		-		-				-			-		-
		0,10	M3	0,001	0,10	100,00	0,001	-			0,10	100,00	0,001
		32,75	Kg	0,002	32,75	100,00	0,002	-			32,75	100,00	0,002
		1,50	M2	0,001	1,50	100,00	0,001	-			1,50	100,00	0,001
4		-		-				-			-		-
		9,78	M3	0,071	9,78	100,00	0,071	-			9,78	100,00	0,071
		1.817,67	Kg	0,135	1.817,67	100,00	0,135	-			1.817,67	100,00	0,135
		78,23	M2	0,067	78,23	100,00	0,067	-			78,23	100,00	0,067
5		-		-				-			-		-
		1,94	M3	0,014	1,94	100,00	0,014	-			1,94	100,00	0,014
		343,41	Kg	0,025	343,41	100,00	0,025	-			343,41	100,00	0,025
		16,03	M2	0,014	16,03	100,00	0,014	-			16,03	100,00	0,014
6		-		-				-			-		-
		1,77	M3	0,013	1,77	100,00	0,013	-			1,77	100,00	0,013
		484,09	Kg	0,036	484,09	100,00	0,036	-			484,09	100,00	0,036
		16,31	M2	0,014	16,31	100,00	0,014	-			16,31	100,00	0,014
7		-		-				-			-		-
		21,64	M3	0,158	21,64	100,00	0,158	-			21,64	100,00	0,158
		3.251,53	Kg	0,241	3.251,53	100,00	0,241	-			3.251,53	100,00	0,241
		183,26	M2	0,157	183,26	100,00	0,157	-			183,26	100,00	0,157
8		-		-				-			-		-
		2,52	M3	0,018	2,52	100,00	0,018	-			2,52	100,00	0,018
		572,37	Kg	0,042	572,37	100,00	0,042	-			572,37	100,00	0,042
		18,64	M2	0,016	18,64	100,00	0,016	-			18,64	100,00	0,016
9		-		-				-			-		-
		21,05	M3	0,154	21,05	100,00	0,154	-			21,05	100,00	0,154
		3.091,91	Kg	0,229	3.091,91	100,00	0,229	-			3.091,91	100,00	0,229
		148,19	M2	0,127	148,19	100,00	0,127	-			148,19	100,00	0,127
10		-		-				-			-		-
		3,83	M3	0,028	3,83	100,00	0,028	-			3,83	100,00	0,028
		684,94	Kg	0,051	684,94	100,00	0,051	-			684,94	100,00	0,051
		26,68	M2	0,023	26,68	100,00	0,023	-			26,68	100,00	0,023
11		-		-				-			-		-
		8,35	M3	0,061	8,35	100,00	0,061	-			8,35	100,00	0,061
		1.809,79	Kg	0,134	1.809,79	100,00	0,134	-			1.809,79	100,00	0,134
		45,28	M2	0,039	45,28	100,00	0,039	-			45,28	100,00	0,039
12		-		-				-			-		-
		88,59	M3	0,647	88,59	100,00	0,647	-			88,59	100,00	0,647
		11.038,76	Kg	0,817	11.038,76	100,00	0,817	-			11.038,76	100,00	0,817
		708,69	M2	0,608	708,69	100,00	0,608	-			708,69	100,00	0,608

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
13				-				-			-		
		3,00	M3	0,022	3,00	100,00	0,022	-			3,00	100,00	0,022
		1.148,96	Kg	0,085	1.148,96	100,00	0,085	-			1.148,96	100,00	0,085
		55,77	M2	0,048	55,77	100,00	0,048	-			55,77	100,00	0,048
14				-				-			-		
		5,22	M3	0,038	5,22	100,00	0,038	-			5,22	100,00	0,038
		1.029,51	Kg	0,076	1.029,51	100,00	0,076	-			1.029,51	100,00	0,076
		55,68	M2	0,048	55,68	100,00	0,048	-			55,68	100,00	0,048
15				-				-			-		
		5,16	M3	0,038	5,16	100,00	0,038	-			5,16	100,00	0,038
		1.047,22	Kg	0,078	1.047,22	100,00	0,078	-			1.047,22	100,00	0,078
		22,32	M2	0,019	22,32	100,00	0,019	-			22,32	100,00	0,019
16				-				-			-		
		2,89	M3	0,021	2,89	100,00	0,021	-			2,89	100,00	0,021
		208,40	Kg	0,015	208,40	100,00	0,015	-			208,40	100,00	0,015
		18,36	M2	0,016	18,36	100,00	0,016	-			18,36	100,00	0,016
17				-				-			-		
		1,66	M3	0,012	1,66	100,00	0,012	-			1,66	100,00	0,012
		268,51	Kg	0,020	268,51	100,00	0,020	-			268,51	100,00	0,020
		11,09	M2	0,010	11,09	100,00	0,010	-			11,09	100,00	0,010
18				-				-			-		
		0,41	M3	0,003	0,41	100,00	0,003	-			0,41	100,00	0,003
		105,28	Kg	0,008	105,28	100,00	0,008	-			105,28	100,00	0,008
		4,34	M2	0,004	4,34	100,00	0,004	-			4,34	100,00	0,004
19				-				-			-		
		0,95	M3	0,007	0,95	100,00	0,007	-			0,95	100,00	0,007
		143,26	Kg	0,011	143,26	100,00	0,011	-			143,26	100,00	0,011
		8,55	M2	0,007	8,55	100,00	0,007	-			8,55	100,00	0,007
20				-				-			-		
a				-				-			-		
			M3	-				-			-		
			Kg	-				-			-		
			M2	-				-			-		
b				-				-			-		
		2,41	M3	0,011	2,41	100,00	0,011	-			2,41	100,00	0,011
		208,00	Kg	0,015	208,00	100,00	0,015	-			208,00	100,00	0,015
		24,13	M2	0,019	24,13	100,00	0,019	-			24,13	100,00	0,019
				5,851			5,851						5,851
B.4	PEKERJAAN LANTAI DAK												
1													
		2,94	M3	0,021	2,94	100,00	0,021	-			2,94	100,00	0,021
		718,04	Kg	0,053	718,04	100,00	0,053	-			718,04	100,00	0,053
		33,60	M2	0,026	33,60	100,00	0,026	-			33,60	100,00	0,026
2				-				-			-		
		0,35	M3	0,003	0,35	100,00	0,003	-			0,35	100,00	0,003
		63,91	Kg	0,005	63,91	100,00	0,005	-			63,91	100,00	0,005
		5,98	M2	0,005	5,98	100,00	0,005	-			5,98	100,00	0,005
3				-				-			-		
		0,57	M3	0,004	0,57	100,00	0,004	-			0,57	100,00	0,004
		108,52	Kg	0,008	108,52	100,00	0,008	-			108,52	100,00	0,008
		5,51	M2	0,005	5,51	100,00	0,005	-			5,51	100,00	0,005
4				-				-			-		
		1,62	M3	0,012	1,62	100,00	0,012	-			1,62	100,00	0,012
		372,56	Kg	0,028	372,56	100,00	0,028	-			372,56	100,00	0,028
		18,36	M2	0,016	18,36	100,00	0,016	-			18,36	100,00	0,016
5				-				-			-		
		1,56	M3	0,011	1,56	100,00	0,011	-			1,56	100,00	0,011
		278,87	Kg	0,021	278,87	100,00	0,021	-			278,87	100,00	0,021
		12,48	M2	0,011	12,48	100,00	0,011	-			12,48	100,00	0,011

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
6				-				-			-		
		1,07	M3	0,008	1,07	100,00	0,008	-			1,07	100,00	0,008
		238,30	Kg	0,018	238,30	100,00	0,018	-			238,30	100,00	0,018
		8,56	M2	0,007	8,56	100,00	0,007	-			8,56	100,00	0,007
7				-				-			-		
		33,93	M3	0,248	33,93	100,00	0,248	-			33,93	100,00	0,248
		5.588,79	Kg	0,414	5.588,79	100,00	0,414	-			5.588,79	100,00	0,414
		356,29	M2	0,306	356,29	100,00	0,306	-			356,29	100,00	0,306
8				-				-			-		
		5,80	M3	0,042	5,80	100,00	0,042	-			5,80	100,00	0,042
		838,31	Kg	0,062	838,31	100,00	0,062	-			838,31	100,00	0,062
		52,20	M2	0,045	52,20	100,00	0,045	-			52,20	100,00	0,045
9				-				-			-		
		4,27	M3	0,031	4,27	100,00	0,031	-			4,27	100,00	0,031
		428,77	Kg	0,032	428,77	100,00	0,032	-			428,77	100,00	0,032
		34,17	M2	0,029	34,17	100,00	0,029	-			34,17	100,00	0,029
10				-				-			-		
		4,05	M3	0,030	4,05	100,00	0,030	-			4,05	100,00	0,030
		199,50	Kg	0,015	199,50	100,00	0,015	-			199,50	100,00	0,015
		16,18	M2	0,014	16,18	100,00	0,014	-			16,18	100,00	0,014
11				-				-			-		
		20,21	M3	0,148	20,21	100,00	0,148	-			20,21	100,00	0,148
		3.532,71	Kg	0,261	3.532,71	100,00	0,261	-			3.532,71	100,00	0,261
		261,26	M2	0,224	261,26	100,00	0,224	-			261,26	100,00	0,224
12				-				-			-		
		1,99	M3	0,015	1,99	100,00	0,015	-			1,99	100,00	0,015
		439,81	Kg	0,033	439,81	100,00	0,033	-			439,81	100,00	0,033
		31,80	M2	0,025	31,80	100,00	0,025	-			31,80	100,00	0,025
13				-				-			-		
		1,27	M3	0,006	1,27	100,00	0,006	-			1,27	100,00	0,006
		522,18	Kg	0,039	522,18	100,00	0,039	-			522,18	100,00	0,039
		12,71	M2	0,011	12,71	100,00	0,011	-			12,71	100,00	0,011
				2,287			2,287						2,287
B.5	PEKERJAAN ATAP	-			-								
1		-			-								
		-	M3	-	-			-			-		
		-	Kg	-	-			-			-		
		-	M2	-	-			-			-		
2		-			-			-			-		
		3,48	M3	0,025	3,48	100,00	0,025	-			3,48	100,00	0,025
		570,64	Kg	0,042	570,64	100,00	0,042	-			570,64	100,00	0,042
		32,19	M2	0,028	32,19	100,00	0,028	-			32,19	100,00	0,028
3		-			-			-			-		
		5,22	M3	0,038	5,22	100,00	0,038	-			5,22	100,00	0,038
		537,10	Kg	0,040	537,10	100,00	0,040	-			537,10	100,00	0,040
		41,78	M2	0,036	41,78	100,00	0,036	-			41,78	100,00	0,036
4		-			-			-			-		
		1,36	M3	0,010	1,36	100,00	0,010	-			1,36	100,00	0,010
		366,67	Kg	0,027	366,67	100,00	0,027	-			366,67	100,00	0,027
		20,43	M2	0,018	20,43	100,00	0,018	-			20,43	100,00	0,018
5		-			-			-			-		
		1,86	M3	0,014	1,86	100,00	0,014	-			1,86	100,00	0,014
		367,69	Kg	0,027	367,69	100,00	0,027	-			367,69	100,00	0,027
		19,22	M2	0,016	19,22	100,00	0,016	-			19,22	100,00	0,016
6		-			-			-			-		
		3,42	M3	0,015	3,42	100,00	0,015	-			3,42	100,00	0,015
		570,04	Kg	0,042	570,04	100,00	0,042	-			570,04	100,00	0,042
		30,78	M2	0,024	30,78	100,00	0,024	-			30,78	100,00	0,024
7		-			-			-			-		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
		1,24	M3	0,006	1,24	100,00	0,006	-			1,24	100,00	0,006
		222,19	Kg	0,016	222,19	100,00	0,016	-			222,19	100,00	0,016
		11,21	M2	0,009	11,21	100,00	0,009	-			11,21	100,00	0,009
		-		0,433	-		0,433						0,433
B.6	PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA												
1		8.728,16	Kg	1,564	8.728,16	100,00	1,564	-			8.728,16	100,00	1,564
2		2.769,78	Kg	0,496	2.769,78	100,00	0,496	-			2.769,78	100,00	0,496
3		6.829,80	Kg	1,224	6.829,80	100,00	1,224	-			6.829,80	100,00	1,224
4		393,60	Kg	0,071	393,60	100,00	0,071	-			393,60	100,00	0,071
5		379,60	Kg	0,068	379,60	100,00	0,068	-			379,60	100,00	0,068
6		112,00	bh	0,020	112,00	100,00	0,020	-			112,00	100,00	0,020
7		752,00	bh	0,135	752,00	100,00	0,135	-			752,00	100,00	0,135
8		1.802,96	kg	0,225	1.802,96	100,00	0,225	-			1.802,96	100,00	0,225
9		28,00	ttk	0,024	28,00	100,00	0,024	-			28,00	100,00	0,024
				3,827			3,827						3,827
				26,286			26,286						26,286
II.C	PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN PENUNJANG												
C.1	PEKERJAAN STRUKTUR GWT DAN RUANG POMPA												
1													
		5,87	M3	0,043	5,87	100,00	0,043	-			5,87	100,00	0,043
		720,46	Kg	0,053	720,46	100,00	0,053	-			720,46	100,00	0,053
		15,33	M2	0,010	15,33	100,00	0,010	-			15,33	100,00	0,010
2		-		-	-		-	-			-		-
		3,91	M3	0,029	3,91	100,00	0,029	-			3,91	100,00	0,029
		537,17	Kg	0,040	537,17	100,00	0,040	-			537,17	100,00	0,040
		26,09	M2	0,018	26,09	100,00	0,018	-			26,09	100,00	0,018
3		-		-	-		-	-			-		-
		2,43	M3	0,018	2,43	100,00	0,018	-			2,43	100,00	0,018
		232,28	Kg	0,017	232,28	100,00	0,017	-			232,28	100,00	0,017
		16,20	M2	0,011	16,20	100,00	0,011	-			16,20	100,00	0,011
4		-		-	-		-	-			-		-
		0,99	M3	0,007	0,99	100,00	0,007	-			0,99	100,00	0,007
		234,55	Kg	0,017	234,55	100,00	0,017	-			234,55	100,00	0,017
			M2	-			-	-			-		-
5		-		-	-		-	-			-		-
		3,29	M3	0,024	3,29	100,00	0,024	-			3,29	100,00	0,024
		520,45	Kg	0,039	520,45	100,00	0,039	-			520,45	100,00	0,039
		10,01	M2	0,008	10,01	100,00	0,008	-			10,01	100,00	0,008
6		-		-	-		-	-			-		-
		3,17	M3	0,023	3,17	100,00	0,023	-			3,17	100,00	0,023
		748,87	Kg	0,055	748,87	100,00	0,055	-			748,87	100,00	0,055
		42,24	M2	0,033	42,24	100,00	0,033	-			42,24	100,00	0,033
7		-		-	-		-	-			-		-
		0,82	M3	0,006	0,82	100,00	0,006	-			0,82	100,00	0,006
		162,58	Kg	0,012	162,58	100,00	0,012	-			162,58	100,00	0,012
		7,54	M2	0,006	7,54	100,00	0,006	-			7,54	100,00	0,006
8		-		-	-		-	-			-		-
		1,96	M3	0,014	1,96	100,00	0,014	-			1,96	100,00	0,014
		408,46	Kg	0,030	408,46	100,00	0,030	-			408,46	100,00	0,030
		24,45	M2	0,020	24,45	100,00	0,020	-			24,45	100,00	0,020
9		-		-	-		-	-			-		-
		0,57	M3	0,004	0,57	100,00	0,004	-			0,57	100,00	0,004
		223,78	Kg	0,017	223,78	100,00	0,017	-			223,78	100,00	0,017
		4,58	M2	0,004	4,58	100,00	0,004	-			4,58	100,00	0,004
10		-		-	-		-	-			-		-
-		-	M3	-	-		-	-			-		-
		5,06	M3	0,002	5,06	100,00	0,002	-			5,06	100,00	0,002

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
			M3	-				-			-		-
11			M3	-				-			-		-
-				-				-			-		-
		2,87	M3	0,004	2,87	100,00	0,004	-			2,87	100,00	0,004
			M3	-				-			-		-
			M3	-				-			-		-
		12,35	M3	0,016	12,35	100,00	0,016	-			12,35	100,00	0,016
12			0	-				-			-		-
-		0,32	M3	0,001	0,32	100,00	0,001	-			0,32	100,00	0,001
			M3	-				-			-		-
		0,27	M3	0,001	0,27	100,00	0,001	-			0,27	100,00	0,001
		1,37	M3	0,006	1,37	100,00	0,006	-			1,37	100,00	0,006
13		15,22	M3	0,001	15,22	100,00	0,001	-			15,22	100,00	0,001
14		42,09	m2	0,067	42,09	100,00	0,067	-			42,09	100,00	0,067
				0,659			0,659						0,659
C.2	PEKERJAAN STRUKTUR STP												
C.2.1	STRUKTUR STP 1												
1		47,12	M3	0,022	47,12	100,00	0,022	-			47,12	100,00	0,022
2		2,77	M3	0,004	2,77	100,00	0,004	-			2,77	100,00	0,004
3		1,00	M3	0,005	1,00	100,00	0,005	-			1,00	100,00	0,005
4				-				-			-		-
		3,95	M3	0,029	3,95	100,00	0,029	-			3,95	100,00	0,029
		548,45	Kg	0,041	548,45	100,00	0,041	-			548,45	100,00	0,041
		4,34	M2	0,004	4,34	100,00	0,004	-			4,34	100,00	0,004
5		47,07	M2	0,061	47,07	100,00	0,061	-			47,07	100,00	0,061
6			M2	-				-			-		-
7		9,62	M3	0,013	9,62	100,00	0,013	-			9,62	100,00	0,013
8		9,62	M3	0,005	9,62	100,00	0,005	-			9,62	100,00	0,005
9		1,00	unit	0,140	1,00	100,00	0,140	-			1,00	100,00	0,140
10				-				-			-		-
		1,43	M3	0,010	1,43	100,00	0,010	-			1,43	100,00	0,010
		44,41	kg	0,003	44,41	100,00	0,003	-			44,41	100,00	0,003
11		59,43	m2	0,020	59,43	100,00	0,020	-			59,43	100,00	0,020
				-				-			-		-
C.2.2	STRUKTUR STP 2			-				-			-		-
1		47,12	M3	0,022	47,12	100,00	0,022	-			47,12	100,00	0,022
2		2,77	M3	0,004	2,77	100,00	0,004	-			2,77	100,00	0,004
3		1,00	M3	0,005	1,00	100,00	0,005	-			1,00	100,00	0,005
4				-				-			-		-
		3,95	M3	0,029	3,95	100,00	0,029	-			3,95	100,00	0,029
		548,45	Kg	0,041	548,45	100,00	0,041	-			548,45	100,00	0,041
		4,34	M2	0,004	4,34	100,00	0,004	-			4,34	100,00	0,004
5		47,07	M2	0,061	47,07	100,00	0,061	-			47,07	100,00	0,061
6			M2	-				-			-		-
7		9,62	M3	0,013	9,62	100,00	0,013	-			9,62	100,00	0,013
8		9,62	M3	0,005	9,62	100,00	0,005	-			9,62	100,00	0,005
9		1,00	unit	0,140	1,00	100,00	0,140	-			1,00	100,00	0,140
10				-				-			-		-
		1,43	M3	0,010	1,43	100,00	0,010	-			1,43	100,00	0,010
		44,41	kg	0,003	44,41	100,00	0,003	-			44,41	100,00	0,003
11		59,43	m2	0,020	59,43	100,00	0,020	-			59,43	100,00	0,020
				0,715			0,715						0,715
C.3	PEKERJAAN STRUKTUR PLAT LANTAI TEMPAT SAMPAH												
1		1,12	M3	0,001	1,12	100,00	0,001	-			1,12	100,00	0,001
2		3,73	M2	0,000	3,73	100,00	0,000	-			3,73	100,00	0,000
3		0,56	M3	0,001	0,56	100,00	0,001	-			0,56	100,00	0,001

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
4				-				-			-		-
		0,56	M3	0,004	0,56	100,00	0,004	-			0,56	100,00	0,004
		64,39	Kg	0,005	64,39	100,00	0,005	-			64,39	100,00	0,005
		2,40	M2	0,002	2,40	100,00	0,002	-			2,40	100,00	0,002
				0,012			0,012						0,012
				1,386			1,386						1,386
III.A	PEKERJAAN ARSITEKTUR BANGUNAN RUSUN												
I.	PEKERJAAN LANTAI SATU												
I.I.													
1		885,98	m2	0,919	885,98	100,00	0,919	-			885,98	100,00	0,919
2		809,59	m2	0,701	809,59	100,00	0,701	-			809,59	100,00	0,701
3		2.765,61	m2	0,946	2.765,61	100,00	0,946	-			2.765,61	100,00	0,946
4		2.349,28	m2	0,539	2.349,28	100,00	0,539	-			2.349,28	100,00	0,539
5		1.062,10	m'	0,477	1.062,10	100,00	0,477	-			1.062,10	100,00	0,477
6		165,21	m'	0,074	165,21	100,00	0,074	-			165,21	100,00	0,074
7		603,99	m2	0,078	603,99	100,00	0,078	-			603,99	100,00	0,078
8		297,07	m2	0,496	297,07	100,00	0,496	-			297,07	100,00	0,496
9		105,68	m2	0,126	105,68	100,00	0,126	-			105,68	100,00	0,126
10			m2	-				-			-		-
11		738,63	m'	0,149	738,63	100,00	0,149	-			738,63	100,00	0,149
12			m'	-				-			-		-
13		18,42	m2	0,025	18,42	100,00	0,025	-			18,42	100,00	0,025
				4,529			4,529						4,529
I.2.	PEKERJAAN KUSEN PINTU / JENDELA + ASSESORIES												
1		2,00	Unit	0,045	2,00	100,00	0,045	-			2,00	100,00	0,045
2		1,00	Unit	0,022	1,00	100,00	0,022	-			1,00	100,00	0,022
3		3,00	Unit	0,046	3,00	100,00	0,046	-			3,00	100,00	0,046
4		10,00	Unit	0,142	10,00	100,00	0,142	-			10,00	100,00	0,142
5		2,00	Unit	0,029	2,00	100,00	0,029	-			2,00	100,00	0,029
6		20,00	Unit	0,280	20,00	100,00	0,280	-			20,00	100,00	0,280
7		4,00	Unit	0,056	4,00	100,00	0,056	-			4,00	100,00	0,056
8		13,00	Unit	0,099	13,00	100,00	0,099	-			13,00	100,00	0,099
9		2,00	Unit	0,018	2,00	100,00	0,018	-			2,00	100,00	0,018
10		3,00	Unit	0,046	3,00	100,00	0,046	-			3,00	100,00	0,046

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
11		1,00	Unit	0,020	1,00	100,00	0,020	-			1,00	100,00	0,020
12		2,00	Unit	0,032	2,00	100,00	0,032	-			2,00	100,00	0,032
13		2,00	Unit	0,025	2,00	100,00	0,025	-			2,00	100,00	0,025
14		1,00	Unit	0,010	1,00	100,00	0,010	-			1,00	100,00	0,010
15			Unit	-				-			-		-
16		12,00	Unit	0,045	12,00	100,00	0,045	-			12,00	100,00	0,045
17		3,00	Unit	0,114	3,00	100,00	0,114	-			3,00	100,00	0,114
18		15,00	Unit	0,206	15,00	100,00	0,206	-			15,00	100,00	0,206
19		12,00	Unit	0,091	12,00	100,00	0,091	-			12,00	100,00	0,091
20		6,00	Unit	0,027	6,00	100,00	0,027	-			6,00	100,00	0,027
21		12,00	Unit	0,040	12,00	100,00	0,040	-			12,00	100,00	0,040
22		6,00	Unit	0,053	6,00	100,00	0,053	-			6,00	100,00	0,053
23		3,00	Unit	0,004	3,00	100,00	0,004	-			3,00	100,00	0,004
24		2,00	Unit	0,004	2,00	100,00	0,004	-			2,00	100,00	0,004
25		2,00	Unit	0,014	2,00	100,00	0,014	-			2,00	100,00	0,014
26		4,00	Unit	0,004	4,00	100,00	0,004	-			4,00	100,00	0,004
27		1,00	Unit	0,004	1,00	100,00	0,004	-			1,00	100,00	0,004
28			0	-				-			-		-
		7,78	m'	0,015	7,78	100,00	0,015	-			7,78	100,00	0,015
		7,24	m'	0,004	7,24	100,00	0,004	-			7,24	100,00	0,004
				-				-			-		-
29				-				-			-		-
		35,54	m'	0,068	35,54	100,00	0,068	-			35,54	100,00	0,068
			m'	-				-			-		-
			0	-				-			-		-
30		12,21	m'	0,017	12,21	100,00	0,017	-			12,21	100,00	0,017
31		1,00	Unit	0,010	1,00	100,00	0,010	-			1,00	100,00	0,010
32		22,50	m'	0,031	22,50	100,00	0,031	-			22,50	100,00	0,031
				1,619			1,619						1,619
I.3	PEKERJAAN PLAFOND												
1		698,91	m2	0,715	698,91	100,00	0,715	-			698,91	100,00	0,715
2		102,67	m2	0,142	102,67	100,00	0,142	-			102,67	100,00	0,142

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
3		898,83	m'	0,171	898,83	100,00	0,171	-			898,83	100,00	0,171
4			m2	-				-					-
				1,028			1,028						1,028
I.4	PEKERJAAN LANTAI												
1		706,31	m2	1,049	706,31	100,00	1,049	-			706,31	100,00	1,049
2		85,94	m2	0,123	85,94	100,00	0,123	-			85,94	100,00	0,123
3		101,40	m2	0,063	101,40	100,00	0,063	-			101,40	100,00	0,063
4		277,09	m2	0,173	263,24	95,00	0,164	13,9	5,00	0,009	277,09	100,00	0,173
5		84,00	pcs	0,012	84,00	100,00	0,012	-			84,00	100,00	0,012
6		25,00	pcs	0,006	25,00	100,00	0,006	-			25,00	100,00	0,006
7		125,71	m2	0,144	125,71	100,00	0,144	-			125,71	100,00	0,144
8		99,44	m'	0,024	99,44	100,00	0,024	-			99,44	100,00	0,024
9			m2	-				-			-		-
10		55,66	m2	0,030	55,66	100,00	0,030	-			55,66	100,00	0,030
11		17,12	m2	0,019	17,12	100,00	0,019	-			17,12	100,00	0,019
12		19,77	m2	0,029	19,77	100,00	0,029	-			19,77	100,00	0,029
13		5,99	m2	0,029	5,99	100,00	0,029	-			5,99	100,00	0,029
				1,700			1,692			0,009			1,700
I.5	PEKERJAAN SANITAIR												
1		15,00	Buah	0,402	15,00	100,00	0,402	-			15,00	100,00	0,402
2		15,00	Buah	0,045	15,00	100,00	0,045	-			15,00	100,00	0,045
3		12,00	Set	0,074	12,00	100,00	0,074	-			12,00	100,00	0,074
4		18,00	Buah	0,032	18,00	100,00	0,032	-			18,00	100,00	0,032
5		36,00	Buah	0,039	36,00	100,00	0,039	-			36,00	100,00	0,039
6		2,00	Unit	0,053	2,00	100,00	0,053	-			2,00	100,00	0,053
7		12,00	Buah	0,009				8,0	66,67	0,006	8,00	66,67	0,006
8		2,00	Buah	0,001				-			-		-
9		2,00	Buah	0,003				2,0	100,00	0,003	2,00	100,00	0,003
10		2,00	Buah	0,003				2,0	100,00	0,003	2,00	100,00	0,003
11		2,00	Buah	0,002				-			-		-
12		12,00	Unit	0,132	12,00	100,00	0,132	-			12,00	100,00	0,132
13		2,00	unit	0,051	2,00	100,00	0,051	-			2,00	100,00	0,051
14		1,00	unit	0,010	1,00	100,00	0,010	-			1,00	100,00	0,010
15		12,00	Unit	0,065	12,00	100,00	0,065	-			12,00	100,00	0,065
				0,921			0,903			0,011			0,915
I.6	PEKERJAAN PENGECATAN												
1		505,71	m2	0,097	505,71	100,00	0,097	-			505,71	100,00	0,097
2		2.333,33	m2	0,398	1.750,00	75,00	0,298	116,7	5,00	0,020	1.866,66	80,00	0,318
3		801,58	m2	0,099	801,58	100,00	0,099	-			801,58	100,00	0,099
4			m2	-				-			-		-
				0,594			0,494			0,020			0,514
				10,391			10,266			0,040			10,305
II	PEKERJAAN LANTAI DUA												
II.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & BETON PRAKTIS												
1		889,46	m2	0,922	889,46	100,00	0,922	-			889,46	100,00	0,922
2		1.009,56	m2	0,874	1.009,56	100,00	0,874	-			1.009,56	100,00	0,874
3		3.085,81	m2	1,055	3.085,81	100,00	1,055	-			3.085,81	100,00	1,055
4		2.595,30	m2	0,596	2.595,30	100,00	0,596	-			2.595,30	100,00	0,596
5		1.205,50	m'	0,541	1.205,50	100,00	0,541	-			1.205,50	100,00	0,541
6		130,44	m'	0,059	130,44	100,00	0,059	-			130,44	100,00	0,059
7		561,71	m2	0,073	561,71	100,00	0,073	-			561,71	100,00	0,073
8		336,14	m2	0,561	336,14	100,00	0,561	-			336,14	100,00	0,561

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
9		123,02	m2	0,146	123,02	100,00	0,146	-			123,02	100,00	0,146
10		60,50	m2	0,033	60,50	100,00	0,033	-			60,50	100,00	0,033
11		756,44	m'	0,152	756,44	100,00	0,152	-			756,44	100,00	0,152
12				-				-			-		-
13		18,42	m2	0,025	18,42	100,00	0,025	-			18,42	100,00	0,025
				5,038			5,038						5,038
II.2	PEKERJAAN KUSEN PINTU / JENDELA + ASSESORIES												
1		16,00	Unit	0,227	16,00	100,00	0,227	-			16,00	100,00	0,227
2		32,00	Unit	0,448	32,00	100,00	0,448	-			32,00	100,00	0,448
3		16,00	Unit	0,121	16,00	100,00	0,121	-			16,00	100,00	0,121
4			Unit	-				-			-		-
5		3,00	Unit	0,046	3,00	100,00	0,046	-			3,00	100,00	0,046
6		16,00	Unit	0,061	16,00	100,00	0,061	-			16,00	100,00	0,061
7		16,00	Unit	0,220	16,00	100,00	0,220	-			16,00	100,00	0,220
8		16,00	Unit	0,121	16,00	100,00	0,121	-			16,00	100,00	0,121
9		1,00	Unit	0,010				-			-		-
10		2,00	Unit	0,007	2,00	100,00	0,007	-			2,00	100,00	0,007
11		16,00	Unit	0,053	16,00	100,00	0,053	-			16,00	100,00	0,053
12		6,00	Unit	0,053	6,00	100,00	0,053	-			6,00	100,00	0,053
13		4,00	Unit	0,006	4,00	100,00	0,006	-			4,00	100,00	0,006
14		2,00	Unit	0,004	2,00	100,00	0,004	-			2,00	100,00	0,004
15		2,00	Unit	0,014	2,00	100,00	0,014	-			2,00	100,00	0,014
16		1,00	Unit	0,014	1,00	100,00	0,014	-			1,00	100,00	0,014
17				-				-			-		-
		10,12	m'	0,019	10,12	100,00	0,019	-			10,12	100,00	0,019
		7,24	m'	0,004	7,24	100,00	0,004	-			7,24	100,00	0,004
		0		-				-			-		-
18		0		-				-			-		-
		35,54	m'	0,068	35,54	100,00	0,068	-			35,54	100,00	0,068
			m'	-				-			-		-
19		1,00	Unit	0,010	1,00	100,00	0,010	-			1,00	100,00	0,010
				1,506			1,496						1,496
II.3	PEKERJAAN PLAFOND												
1		674,91	m2	0,690	674,91	100,00	0,690	-			674,91	100,00	0,690

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
2		87,50	m2	0,121	87,50	100,00	0,121	-			87,50	100,00	0,121
3		951,98	m'	0,181	951,98	100,00	0,181	-			951,98	100,00	0,181
4			m2	-				-			-		-
				0,992			0,992						0,992
II.4	PEKERJAAN LANTAI												
1		656,78	m2	0,975	656,78	100,00	0,975	-			656,78	100,00	0,975
2		24,79	m2	0,035	24,79	100,00	0,035	-			24,79	100,00	0,035
3		98,84	m2	0,062	98,84	100,00	0,062	-			98,84	100,00	0,062
4		125,71	m2	0,144	125,71	100,00	0,144	-			125,71	100,00	0,144
5		99,44	m'	0,024	99,44	100,00	0,024	-			99,44	100,00	0,024
6		100,04	m2	0,055	100,04	100,00	0,055	-			100,04	100,00	0,055
7		100,62	m2	0,053	100,62	100,00	0,053	-			100,62	100,00	0,053
8		16,54	m2	0,025	16,54	100,00	0,025	-			16,54	100,00	0,025
9		5,99	m2	0,029	5,99	100,00	0,029	-			5,99	100,00	0,029
				1,402			1,402						1,402
		-		-	-								
II.5	PEKERJAAN SANITAIR												
1		16,00	Buah	0,429	15,00	93,75	0,402	1,0	6,25	0,027	16,00	100,00	0,429
2		16,00	Buah	0,048	15,00	93,75	0,045	1,0	6,25	0,003	16,00	100,00	0,048
3		16,00	Set	0,098	15,00	93,75	0,092	1,0	6,25	0,006	16,00	100,00	0,098
4		18,00	Buah	0,032	17,00	94,44	0,031	1,0	5,56	0,002	18,00	100,00	0,032
5		39,00	Buah	0,043	38,00	97,44	0,041	1,0	2,56	0,001	39,00	100,00	0,043
6		-	Unit	-	-			-			-		-
7		16,00	Buah	0,012	-			8,0	50,00	0,006	8,00	50,00	0,006
8		16,00	Unit	0,176	15,00	93,75	0,165	1,0	6,25	0,011	16,00	100,00	0,176
9		16,00	Unit	0,087	16,00	100,00	0,087	-			16,00	100,00	0,087
		-		0,925	-		0,863			0,056			0,919
II.6	PEKERJAAN PENGECATAN												
1		507,74	m2	0,097	507,74	100,00	0,097	-			507,74	100,00	0,097
2		2.529,06	m2	0,431	2.402,61	95,00	0,409	25,3	1,00	0,004	2.427,90	96,00	0,414
3		762,41	m2	0,094	762,41	100,00	0,094	-			762,41	100,00	0,094
4		16,58	m2	0,003	16,58	100,00	0,003	-			16,58	100,00	0,003
				0,625			0,604			0,004			0,608
				10,488			10,395			0,060			10,455
III.	PEKERJAAN LANTAI TIGA												
III.1													
1		915,38	m2	0,949	915,38	100,00	0,949	-			915,38	100,00	0,949
2		934,58	m2	0,809	934,58	100,00	0,809	-			934,58	100,00	0,809
3		2.909,25	m2	0,995	2.909,25	100,00	0,995	-			2.909,25	100,00	0,995
4		2.586,66	m2	0,594	2.586,66	100,00	0,594	-			2.586,66	100,00	0,594
5		1.173,40	m'	0,527	1.173,40	100,00	0,527	-			1.173,40	100,00	0,527
6		661,88	m'	0,297	661,88	100,00	0,297	-			661,88	100,00	0,297
7		542,42	m2	0,070	542,42	100,00	0,070	-			542,42	100,00	0,070
8		336,14	m2	0,561	336,14	100,00	0,561	-			336,14	100,00	0,561
9		123,02	m2	0,146	123,02	100,00	0,146	-			123,02	100,00	0,146
10		60,50	m2	0,033	60,50	100,00	0,033	-			60,50	100,00	0,033
11		756,44	m'	0,152	756,44	100,00	0,152	-			756,44	100,00	0,152
12			m'	-				-			-		-
13		18,42	m2	0,025	18,42	100,00	0,025	-			18,42	100,00	0,025
				5,159			5,159						5,159
III.2													

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
1		16,00	Unit	0,227	16,00	100,00	0,227	-			16,00	100,00	0,227
2		32,00	Unit	0,448	32,00	100,00	0,448	-			32,00	100,00	0,448
3		16,00	Unit	0,121	16,00	100,00	0,121	-			16,00	100,00	0,121
4		3,00	Unit	0,046	3,00	100,00	0,046	-			3,00	100,00	0,046
5		16,00	Unit	0,061	16,00	100,00	0,061	-			16,00	100,00	0,061
6		16,00	Unit	0,220	16,00	100,00	0,220	-			16,00	100,00	0,220
7		16,00	Unit	0,121	16,00	100,00	0,121	-			16,00	100,00	0,121
8		2,00	Unit	0,004	2,00	100,00	0,004	-			2,00	100,00	0,004
9		2,00	Unit	0,014	2,00	100,00	0,014	-			2,00	100,00	0,014
10			Unit	-				-			-		-
11			Unit	-				-			-		-
12			Unit	-				-			-		-
13			0	-				-			-		-
		38,77	m'	0,074	38,77	100,00	0,074	-			38,77	100,00	0,074
			m'	-				-			-		-
14		1,00	Unit	0,010	1,00	100,00	0,010	-			1,00	100,00	0,010
15		1,00	Unit	0,018	1,00	100,00	0,018	-			1,00	100,00	0,018
16		1,00	Unit	0,010				-			-		-
17		2,00	Unit	0,007	2,00	100,00	0,007	-			2,00	100,00	0,007
18		16,00	Unit	0,053	16,00	100,00	0,053	-			16,00	100,00	0,053
19		6,00	Unit	0,053	6,00	100,00	0,053	-			6,00	100,00	0,053
20		4,00	Unit	0,006	4,00	100,00	0,006	-			4,00	100,00	0,006
				1,493			1,483						1,483
III.3													
1		694,93	m2	0,711	694,93	100,00	0,711	-			694,93	100,00	0,711
2		95,26	m2	0,132	95,26	100,00	0,132	-			95,26	100,00	0,132
3		961,88	m'	0,183	961,88	100,00	0,183	-			961,88	100,00	0,183
4			m2	-				-			-		-
				1,026			1,026						1,026
III.4													
1		656,78	m2	0,975	656,78	100,00	0,975	-			656,78	100,00	0,975
2		24,79	m2	0,035	24,79	100,00	0,035	-			24,79	100,00	0,035
3		98,84	m2	0,062	98,84	100,00	0,062	-			98,84	100,00	0,062
4		125,71	m2	0,029	125,71	100,00	0,029	-			125,71	100,00	0,029
5		59,64	m'	0,014	59,64	100,00	0,014	-			59,64	100,00	0,014
6		100,04	m2	0,055	100,04	100,00	0,055	-			100,04	100,00	0,055
7		55,66	m2	0,030	55,66	100,00	0,030	-			55,66	100,00	0,030
8		16,54	m2	0,025	16,54	100,00	0,025	-			16,54	100,00	0,025
9		5,99	m2	0,029	5,99	100,00	0,029	-			5,99	100,00	0,029
				1,254			1,254						1,254

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
III.5													
1		16,00	Buah	0,429	13,00	81,25	0,349	3,0	18,75	0,080	16,00	100,00	0,429
2		16,00	Buah	0,048	13,00	81,25	0,039	3,0	18,75	0,009	16,00	100,00	0,048
3		16,00	Set	0,098	13,00	81,25	0,080	3,0	18,75	0,018	16,00	100,00	0,098
4		18,00	Buah	0,032	15,00	83,33	0,027	3,0	16,67	0,005	18,00	100,00	0,032
5		39,00	Buah	0,043	36,00	92,31	0,039	3,0	7,69	0,003	39,00	100,00	0,043
6			Unit	-				-			-		-
7		16,00	Buah	0,012				8,0	50,00	0,006	8,00	50,00	0,006
8		16,00	Unit	0,176	13,00	81,25	0,143	3,0	18,75	0,033	16,00	100,00	0,176
9		16,00	Unit	0,087	13,00	81,25	0,071	3,0	18,75	0,016	16,00	100,00	0,087
				0,925			0,747			0,172			0,919
III.6													
1		502,44	m2	0,096	502,44	100,00	0,096	-			502,44	100,00	0,096
2		2.506,43	m2	0,427	2.381,11	95,00	0,406	25,1	1,00	0,004	2.406,17	96,00	0,410
3		790,19	m2	0,098	790,19	100,00	0,098	-			790,19	100,00	0,098
4			m2	-				-			-		-
				0,621			0,600			0,004			0,604
				10,477			10,268			0,176			10,444
IV													
IV.1													
1		181,21	m2	0,188	181,21	100,00	0,188	-			181,21	100,00	0,188
2		289,56	m2	0,099	289,56	100,00	0,099	-			289,56	100,00	0,099
3		267,24	m2	0,061	267,24	100,00	0,061	-			267,24	100,00	0,061
4		48,62	m'	0,022	48,62	100,00	0,022	-			48,62	100,00	0,022
5		61,40	m'	0,028	61,40	100,00	0,028	-			61,40	100,00	0,028
6		383,34	m2	0,050	383,34	100,00	0,050	-			383,34	100,00	0,050
				0,447			0,447				-		0,447
IV.2													
1		2,00	Unit	0,031	2,00	100,00	0,031	-			2,00	100,00	0,031
2		6,00	Unit	0,040	6,00	100,00	0,040	-			6,00	100,00	0,040
3		2,00	Unit	0,007				-			-		-
				0,078			0,070						0,070
IV.3													
1		35,60	m2	0,005	35,60	100,00	0,005	-			35,600	100,00	0,005
				0,005			0,005						0,005
IV.4													
1		172,08	m2	0,091	172,08	100,00	0,091	-			172,08	100,00	0,091
2		198,83	m2	0,020	198,83	100,00	0,020	-			198,83	100,00	0,020
3		70,88	m2	0,020	70,88	100,00	0,020	-			70,88	100,00	0,020
4		80,56	m2	0,101	80,56	100,00	0,101	-			80,56	100,00	0,101
				0,232			0,232						0,232
IV.5													
1		8,00	Buah	0,009				-					-
				0,009									-
IV.6													
1		454,04	m2	0,087	454,04	100,00	0,087	-			454,04	100,00	0,087
2		183,10	m2	0,031	183,10	100,00	0,031	-			183,10	100,00	0,031
3		35,60	m2	0,006	35,60	100,00	0,006	-			35,60	100,00	0,006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
4			m2	-				-			-		-
				0,124			0,124						0,124
IV.7													
1		999,12	m2	1,639	999,12	100,00	1,639	-			999,12	100,00	1,639
2		39,03	m2	0,064	39,03	100,00	0,064	-			39,03	100,00	0,064
2		21,60	m'	0,007	21,60	100,00	0,007	-			21,60	100,00	0,007
3		55,00	m'	0,016	55,00	100,00	0,016	-			55,00	100,00	0,016
4		6,60	m'	0,002	6,60	100,00	0,002	-			6,60	100,00	0,002
5		110,44	m'	0,034	110,44	100,00	0,034	-			110,44	100,00	0,034
6			m'	-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				1,763			1,763						1,763
				2,658			2,642						2,642
V.													
1		2,00	bh	0,024				-			-		-
2		9,00	Buah	0,036				-			-		-
3			m'	-				-			-		-
4			bh	-				-			-		-
5			m2	-				-			-		-
6			bh	-				-			-		-
7		2,00	Buah	0,013	2,00	100,00	0,013	-			2,00	100,00	0,013
8			m2	-				-			-		-
9			m2	-				-			-		-
10		56,00	unit	0,008				-			-		-
11		3,00	unit	0,000				-			-		-
12		5,00	unit	0,002				-			-		-
13			unit	-				-			-		-
14		6,00	unit	0,001				-			-		-
15		2,00	unit	0,002				-			-		-
16		409,10	m2	3,988	347,74	85,00	3,389	12,3	3,00	0,120	360,01	88,00	3,509
				4,074			3,403			0,120			3,522
				4,074			3,403			0,120			3,522
III.B	PEKERJAAN BANGUNAN PENUNJANG												
1													
		10,73	m2	0,011	10,73	100,00	0,011	-			10,73	100,00	0,011
		61,58	m2	0,021	61,58	100,00	0,021	-			61,58	100,00	0,021
		61,58	m2	0,014	61,58	100,00	0,014	-			61,58	100,00	0,014
		9,31	m2	0,005	9,31	100,00	0,005	-			9,31	100,00	0,005
		60,86	m2	0,008	60,86	100,00	0,008	-			60,86	100,00	0,008
		9,31	m2	0,001	9,31	100,00	0,001	-			9,31	100,00	0,001
		8,01	m2	0,004	8,01	100,00	0,004	-			8,01	100,00	0,004
		71,59	m2	0,014	71,59	100,00	0,014	-			71,59	100,00	0,014
		10,73	m2	0,002	10,73	100,00	0,002	-			10,73	100,00	0,002
		9,31	m2	0,002	9,31	100,00	0,002	-			9,31	100,00	0,002
		5,60	unit	0,018	5,60	100,00	0,018	-			5,60	100,00	0,018
		46,03	m2	0,076	46,03	100,00	0,076	-			46,03	100,00	0,076
		9,55	m'	0,003	9,55	100,00	0,003	-			9,55	100,00	0,003
		5,14	m2	0,008	5,14	100,00	0,008	-			5,14	100,00	0,008
		0		-				-			-		-
		19,02	m2	0,011	19,02	100,00	0,011	-			19,02	100,00	0,011
		26,30	m2	0,009	26,30	100,00	0,009	-			26,30	100,00	0,009
		26,30	m2	0,006	26,30	100,00	0,006	-			26,30	100,00	0,006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
		19,02	m2	0,006	19,02	100,00	0,006	-			19,02	100,00	0,006
			m3	-				-			-		-
			phn	-				-			-		-
		1,00	unit	0,020	1,00	100,00	0,020	-			1,00	100,00	0,020
		28,78	m1	0,009	28,78	100,00	0,009	-			28,78	100,00	0,009
				0,248			0,248						0,248
				0,248			0,248						0,248
IV	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLUMBING												
I	PEKERJAAN PLUMBING (ARUNIKA 3 LANTAI)												
A	PERALATAN UTAMA												
1		2,00	unit	0,680	2,00	100,00	0,680	-			2,00	100,00	0,680
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
2		1,00	set	0,340	1,00	100,00	0,340	-			1,00	100,00	0,340
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
3		2,00	unit	0,280	2,00	100,00	0,280	-			2,00	100,00	0,280
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
4		1,00	lot	0,040	1,00	100,00	0,040	-			1,00	100,00	0,040
				-				-			-		-
5		1,00	unit	0,010				-			-		-
								-			-		-
								-			-		-
								-			-		-
				1,350			1,340						1,340
B	PIPA AIR BERSIH												
1		1,00	set	0,003	1,00	100,00	0,003	-			1,00	100,00	0,003
2		1,00	set	0,003	1,00	100,00	0,003	-			1,00	100,00	0,003
3		3,00	m	0,004	3,00	100,00	0,004	-			3,00	100,00	0,004
4		2,00	m	0,002	2,00	100,00	0,002	-			2,00	100,00	0,002
5		3,00	m	0,001	3,00	100,00	0,001	-			3,00	100,00	0,001
6		11,00	m	0,003	11,00	100,00	0,003	-			11,00	100,00	0,003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
7		2,00	bh	0,008	2,00	100,00	0,008	-			2,00	100,00	0,008
8		2,00	bh	0,004	2,00	100,00	0,004	-			2,00	100,00	0,004
9		2,00	bh	0,003	2,00	100,00	0,003	-			2,00	100,00	0,003
10		2,00	bh	0,005	2,00	100,00	0,005	-			2,00	100,00	0,005
11		4,00	bh	0,011	4,00	100,00	0,011	-			4,00	100,00	0,011
12		4,00	bh	0,008	4,00	100,00	0,008	-			4,00	100,00	0,008
13		4,00	bh	0,008	4,00	100,00	0,008	-			4,00	100,00	0,008
14		1,00	bh	0,005	1,00	100,00	0,005	-			1,00	100,00	0,005
15		1,00	bh	0,001	1,00	100,00	0,001	-			1,00	100,00	0,001
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		1,00	set	0,004	1,00	100,00	0,004	-			1,00	100,00	0,004
2		1,00	set	0,004	1,00	100,00	0,004	-			1,00	100,00	0,004
3		5,00	m	0,007	5,00	100,00	0,007	-			5,00	100,00	0,007
4		7,00	m	0,010	7,00	100,00	0,010	-			7,00	100,00	0,010
5		5,00	m	0,002	5,00	100,00	0,002	-			5,00	100,00	0,002
6		7,00	m	0,002	7,00	100,00	0,002	-			7,00	100,00	0,002
7		5,00	m	0,001	5,00	100,00	0,001	-			5,00	100,00	0,001
8		3,00	bh	0,007	3,00	100,00	0,007	-			3,00	100,00	0,007
9		2,00	bh	0,003	2,00	100,00	0,003	-			2,00	100,00	0,003
10		2,00	bh	0,005	2,00	100,00	0,005	-			2,00	100,00	0,005
11		2,00	bh	0,003	2,00	100,00	0,003	-			2,00	100,00	0,003
12		2,00	bh	0,005	2,00	100,00	0,005	-			2,00	100,00	0,005
13		2,00	bh	0,003	2,00	100,00	0,003	-			2,00	100,00	0,003
14		2,00	bh	0,003	2,00	100,00	0,003	-			2,00	100,00	0,003
15		2,00	bh	0,002	2,00	100,00	0,002	-			2,00	100,00	0,002
16		2,00	bh	0,000	2,00	100,00	0,000	-			2,00	100,00	0,000
17		2,00	bh	0,011	2,00	100,00	0,011	-			2,00	100,00	0,011
18		1,00	bh	0,001	1,00	100,00	0,001	-			1,00	100,00	0,001
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1			m	-				-			-		-
2			m	-				-			-		-
3		11,00	m	0,009	11,00	100,00	0,009	-			11,00	100,00	0,009
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		84,00	m	0,022	84,00	100,00	0,022	-			84,00	100,00	0,022
2		72,00	m	0,010	72,00	100,00	0,010	-			72,00	100,00	0,010
3		168,00	m	0,019	168,00	100,00	0,019	-			168,00	100,00	0,019
4		12,00	bh	0,016	12,00	100,00	0,016	-			12,00	100,00	0,016
5		12,00	bh	0,025	12,00	100,00	0,025	-			12,00	100,00	0,025
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		8,00	m	0,003	8,00	100,00	0,003	-			8,00	100,00	0,003
2		6,00	m	0,002	6,00	100,00	0,002	-			6,00	100,00	0,002
3		22,00	m	0,003	22,00	100,00	0,003	-			22,00	100,00	0,003
4		20,00	m	0,002	20,00	100,00	0,002	-			20,00	100,00	0,002
5		2,00	m	0,005	2,00	100,00	0,005	-			2,00	100,00	0,005
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1			m	-				-			-		-
2		7,50	m	0,002	7,50	100,00	0,002	-			7,50	100,00	0,002
3		8,50	m	0,001	8,50	100,00	0,001	-			8,50	100,00	0,001
4		42,00	m	0,005	42,00	100,00	0,005	-			42,00	100,00	0,005
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		7,50	m	0,002	7,50	100,00	0,002	-			7,50	100,00	0,002
2		4,00	m	0,001	4,00	100,00	0,001	-			4,00	100,00	0,001
3		40,00	m	0,004	40,00	100,00	0,004	-			40,00	100,00	0,004

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		112,00	m	0,029	112,00	100,00	0,029	-			112,00	100,00	0,029
2		96,00	m	0,013	96,00	100,00	0,013	-			96,00	100,00	0,013
3		199,00	m	0,022	199,00	100,00	0,022	-			199,00	100,00	0,022
4		16,00	bh	0,021	16,00	100,00	0,021	-			16,00	100,00	0,021
5		16,00	bh	0,034	16,00	100,00	0,034	-			16,00	100,00	0,034
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		5,00	m	0,000	5,00	100,00	0,000	-			5,00	100,00	0,000
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		6,00	m	0,000	6,00	100,00	0,000	-			6,00	100,00	0,000
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1			m	-				-			-		-
2		120,00	m	0,103	120,00	100,00	0,103	-			120,00	100,00	0,103
3		16,00	m	0,014	16,00	100,00	0,014	-			16,00	100,00	0,014
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		112,00	m	0,028	112,00	100,00	0,028	-			112,00	100,00	0,028
2		96,00	m	0,015	96,00	100,00	0,015	-			96,00	100,00	0,015
3		199,00	m	0,015	199,00	100,00	0,015	-			199,00	100,00	0,015
4		16,00	bh	0,021	16,00	100,00	0,021	-			16,00	100,00	0,021
5		16,00	bh	0,034	12,00	75,00	0,026	4,0	25,00	0,009	16,00	100,00	0,034
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		5,00	m	0,000	5,00	100,00	0,000	-			5,00	100,00	0,000
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		6,00	m	0,000	6,00	100,00	0,000	-			6,00	100,00	0,000
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1			m	-				-			-		-
2		34,00	m	0,029	34,00	100,00	0,029	-			34,00	100,00	0,029
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		104,00	m	0,089	104,00	100,00	0,089	-			104,00	100,00	0,089
2		9,00	m	0,002	9,00	100,00	0,002	-			9,00	100,00	0,002
3		9,00	m	0,002	9,00	100,00	0,002	-			9,00	100,00	0,002
				-				-			-		-
				0,745			0,736			0,009			0,745
C	PIPA AIR BEKAS												
				-				-			-		-
1			m	-				-			-		-
2		8,00	m	0,006	8,00	100,00	0,006	-			8,00	100,00	0,006
3		7,00	m	0,003	7,00	100,00	0,003	-			7,00	100,00	0,003
4		3,00	m	0,001	3,00	100,00	0,001	-			3,00	100,00	0,001
5		10,00	m	0,002	10,00	100,00	0,002	-			10,00	100,00	0,002
6		4,00	bh	0,013	2,00	50,00	0,006	2,0	50,00	0,006	4,00	100,00	0,013
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		8,00	m	0,006	8,00	100,00	0,006	-			8,00	100,00	0,006
2		180,00	m	0,072	180,00	100,00	0,072	-			180,00	100,00	0,072

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
3			m	-				-			-		-
4		78,00	m	0,018	78,00	100,00	0,018	-			78,00	100,00	0,018
5		12,00		-	12,00	100,00		-			12,00	100,00	-
6		12,00	bh	0,025	12,00	100,00	0,025	-			12,00	100,00	0,025
7		12,00	bh	0,023	12,00	100,00	0,023	-			12,00	100,00	0,023
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		4,00	m	0,002	4,00	100,00	0,002	-			4,00	100,00	0,002
2			m	-				-			-		-
3		2,00	m	0,000	2,00	100,00	0,000	-			2,00	100,00	0,000
4		2,00		-	2,00	100,00		-			2,00	100,00	-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		14,00	m	0,006	14,00	100,00	0,006	-			14,00	100,00	0,006
2		2,00	m	0,001	2,00	100,00	0,001	-			2,00	100,00	0,001
3		14,00	m	0,003	14,00	100,00	0,003	-			14,00	100,00	0,003
4		1,00	bh	0,002	1,00	100,00	0,002	-			1,00	100,00	0,002
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		16,00	m	0,011	16,00	100,00	0,011	-			16,00	100,00	0,011
2		895,00	m	0,357	895,00	100,00	0,357	-			895,00	100,00	0,357
3		5,00	m	0,002	5,00	100,00	0,002	-			5,00	100,00	0,002
4			m	-				-			-		-
5			m	-				-			-		-
6		2,00	m	0,001	2,00	100,00	0,001	-			2,00	100,00	0,001
7		30,00	m	0,007	30,00	100,00	0,007	-			30,00	100,00	0,007
8			bh	-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1			m	-				-			-		-
2		72,00	m	0,024	72,00	100,00	0,024	-			72,00	100,00	0,024
3		10,00	m	0,002	10,00	100,00	0,002	-			10,00	100,00	0,002
4				-				-			-		-
5		16,00	bh	0,030	16,00	100,00	0,030	-			16,00	100,00	0,030
6		16,00	bh	0,031	14,00	87,50	0,027	2,0	12,50	0,004	16,00	100,00	0,031
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		96,00	m	0,038	96,00	100,00	0,038	-			96,00	100,00	0,038
2		4,00	m	0,001	4,00	100,00	0,001	-			4,00	100,00	0,001
3			m	-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1				-				-			-		-
2		64,00	m	0,021	64,00	100,00	0,021	-			64,00	100,00	0,021
3		112,00	m	0,026	112,00	100,00	0,026	-			112,00	100,00	0,026
4				-				-			-		-
5		16,00	bh	0,030	8,00	50,00	0,015	8,0	50,00	0,015	16,00	100,00	0,030
		16,00	bh	0,031	14,00	87,50	0,027	2,0	12,50	0,004	16,00	100,00	0,031
				-				-			-		-
1				-				-			-		-
2		4,00	m	0,002	4,00	100,00	0,002	-			4,00	100,00	0,002
3		2,00	m	0,001	2,00	100,00	0,001	-			2,00	100,00	0,001
4		2,00	m	0,000	2,00	100,00	0,000	-			2,00	100,00	0,000
				0,797			0,768			0,029			0,797
D	PIPA AIR KOTOR												

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
1		10,00	m	0,013	10,00	100,00	0,013	-			10,00	100,00	0,013
2			m	-				-			-		-
3			bh	-				-			-		-
4			bh	-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		38,00	m	0,048	38,00	100,00	0,048	-			38,00	100,00	0,048
2		32,00	m	0,023	32,00	100,00	0,023	-			32,00	100,00	0,023
3		4,00	m	0,001	4,00	100,00	0,001	-			4,00	100,00	0,001
4		16,00	bh	0,034	16,00	100,00	0,034	-			16,00	100,00	0,034
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		4,00	m	0,005	4,00	100,00	0,005	-			4,00	100,00	0,005
2		11,00	m	0,014	11,00	100,00	0,014	-			11,00	100,00	0,014
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		48,00	m	0,034	48,00	100,00	0,034	-			48,00	100,00	0,034
2		32,00	m	0,023	32,00	100,00	0,023	-			32,00	100,00	0,023
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		64,00	m	0,046	64,00	100,00	0,046	-			64,00	100,00	0,046
2		32,00	m	0,023	32,00	100,00	0,023	-			32,00	100,00	0,023
				-				-			-		-
				0,264			0,264						0,264
E													
	PIPA VENTING												
				-									
				-									
1		5,00	m	0,002	5,00	100,00	0,002	-			5,00	100,00	0,002
2		50,00	m	0,009	50,00	100,00	0,009	-			50,00	100,00	0,009
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		144,00	m	0,018	144,00	100,00	0,018	-			144,00	100,00	0,018
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		10,00	m	0,002	10,00	100,00	0,002	-			10,00	100,00	0,002
2		28,00	m	0,003	28,00	100,00	0,003	-			28,00	100,00	0,003
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		22,00	m	0,013	22,00	100,00	0,013	-			22,00	100,00	0,013
1		6,00	m	0,002	6,00	100,00	0,002	-			6,00	100,00	0,002
2		45,00	m	0,008	45,00	100,00	0,008	-			45,00	100,00	0,008
				-				-			-		-
				-				-			-		-
3		192,00	m	0,024	192,00	100,00	0,024	-			192,00	100,00	0,024
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		22,00	m	0,013	22,00	100,00	0,013	-			22,00	100,00	0,013
1		6,00	m	0,002	6,00	100,00	0,002	-			6,00	100,00	0,002
2		45,00	m	0,008	45,00	100,00	0,008	-			45,00	100,00	0,008
				-				-			-		-
				-				-			-		-

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
3		192,00	m	0,024	192,00	100,00	0,024	-			192,00	100,00	0,024
				0,127			0,127						0,127
F	PIPA AIR HUJAN												
1		47,00	m	0,034	47,00	100,00	0,034	-			47,00	100,00	0,034
2		3,00	m	0,001	3,00	100,00	0,001	-			3,00	100,00	0,001
3			m	-				-			-		-
4			m	-				-			-		-
5				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		56,00	m	0,040	56,00	100,00	0,040	-			56,00	100,00	0,040
2			m	-				-			-		-
3			m	-				-			-		-
4		4,00	m	0,001	4,00	100,00	0,001	-			4,00	100,00	0,001
5			m	-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		56,00	m	0,040	56,00	100,00	0,040	-			56,00	100,00	0,040
2			m	-				-			-		-
3			m	-				-			-		-
4		4,00	m	0,001	4,00	100,00	0,001	-			4,00	100,00	0,001
5			m	-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		52,00	m	0,037	52,00	100,00	0,037	-			52,00	100,00	0,037
2		10,00	m	0,007	10,00	100,00	0,007	-			10,00	100,00	0,007
3		117,00	m	0,047	117,00	100,00	0,047	-			117,00	100,00	0,047
4		20,00	m	0,034	20,00	100,00	0,034	-			20,00	100,00	0,034
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		16,00	m	0,011	16,00	100,00	0,011	-			16,00	100,00	0,011
2		7,00	m	0,005	7,00	100,00	0,005	-			7,00	100,00	0,005
3		16,00	m	0,028	16,00	100,00	0,028	-			16,00	100,00	0,028
				0,287			0,287						0,287
				3,571			3,523			0,038			3,561
V	SITEPLAN												
V.1	PEKERJAAN PLAMING												
1			unit	-				-			-		-
2		97,00	m	0,036	97,00	100,00	0,036	-			97,00	100,00	0,036
3		15,00	m	0,025	15,00	100,00	0,025	-			15,00	100,00	0,025
4		20,00	m	0,017	20,00	100,00	0,017	-			20,00	100,00	0,017
5			m	-				-			-		-
6				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		70,00	m	0,089	70,00	100,00	0,089	-			70,00	100,00	0,089
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		90,00	m	0,197	90,00	100,00	0,197	-			90,00	100,00	0,197
				-				-			-		-
2		2,00	unit	0,479	2,00	100,00	0,479	-			2,00	100,00	0,479
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
1				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		1,00	set	0,258	1,00	100,00	0,258	-			1,00	100,00	0,258
				1,101			1,101						1,101
				1,101			1,101						1,101
V.2	PEKERJAAN GWT (FRP)		set					-					-
				-									-
II.	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (ARUNIKA 3 LANTAI)												
A.	FIRE HYDRANT												
1		17,00	m	0,062	17,00	100,00	0,062	-			17,00	100,00	0,062
2		12,00	m	0,044	12,00	100,00	0,044	-			12,00	100,00	0,044
3		1,00	bh	0,033	1,00	100,00	0,033	-			1,00	100,00	0,033
4		1,00	bh	0,047	1,00	100,00	0,047	-			1,00	100,00	0,047
5		1,00	bh	0,028	1,00	100,00	0,028	-			1,00	100,00	0,028
6		1,00	bh	0,069	1,00	100,00	0,069	-			1,00	100,00	0,069
7		1,00	bh	0,033	1,00	100,00	0,033	-			1,00	100,00	0,033
8		1,00	bh	0,009	1,00	100,00	0,009	-			1,00	100,00	0,009
9		3,00	bh	0,021	3,00	100,00	0,021	-			3,00	100,00	0,021
				0,347			0,347						0,347
				0,347			0,347						0,347
III	PEKERJAAN TATA UDARA ARUNIKA (3 LANTAI)												
A	PERALATAN UTAMA AC												
1		1,00	Unit	0,050	1,00	100,00	0,050	-			1,00	100,00	0,050
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
2		1,00	Unit	0,050	1,00	100,00	0,050	-			1,00	100,00	0,050
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
3		1,00	Unit	0,050	1,00	100,00	0,050	-			1,00	100,00	0,050
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
4		1,00	Unit	0,050	1,00	100,00	0,050	-			1,00	100,00	0,050
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
B	PERALATAN UTAMA FAN												
1		2,00	Unit	0,016	2,00	100,00	0,016	-			2,00	100,00	0,016
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
2		1,00	Unit	0,008	1,00	100,00	0,008	-			1,00	100,00	0,008
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
3		1,00	Unit	0,009	1,00	100,00	0,009	-			1,00	100,00	0,009
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
4		1,00	Unit	0,015	1,00	100,00	0,015	-			1,00	100,00	0,015
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
5		2,00	Unit	0,019	2,00	100,00	0,019	-			2,00	100,00	0,019
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		12,00	Unit	0,036	12,00	100,00	0,036	-			12,00	100,00	0,036
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
2				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
3				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
4		12,00	unit	0,036	12,00	100,00	0,036	-			12,00	100,00	0,036
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		2,00	Unit	0,016	2,00	100,00	0,016	-			2,00	100,00	0,016
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
2		1,00	Unit	0,008	1,00	100,00	0,008	-			1,00	100,00	0,008
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
3		1,00	Unit	0,008	1,00	100,00	0,008	-			1,00	100,00	0,008
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		16,00	Unit	0,049	16,00	100,00	0,049	-			16,00	100,00	0,049
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
2				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
3				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
4		16,00	unit	0,049	16,00	100,00	0,049	-			16,00	100,00	0,049
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		2,00	Unit	0,016	2,00	100,00	0,016	-			2,00	100,00	0,016
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
2		1,00	Unit	0,008	1,00	100,00	0,008	-			1,00	100,00	0,008
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
3		1,00	Unit	0,008	1,00	100,00	0,008	-			1,00	100,00	0,008
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		16,00	Unit	0,049	16,00	100,00	0,049	-			16,00	100,00	0,049
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
2				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
3				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
4		16,00	unit	0,049	16,00	100,00	0,049	-			16,00	100,00	0,049
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
				0,398			0,398						0,398
C	PIPA REFRIGRANT DAN PIPA DRAIN												
	Lantai 1												

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
				0,492			0,492						0,492
E	Testing dan Commissioning							-			-		-
1	Testing dan Commissioning	1,00	lot	0,034				-			-		-
				0,034									-
				5,876			5,842						5,842
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUNIKA 3 LANTAI												
A	PEKERJAAN PANEL LISTRIK												
1		164.600,00	VA	0,638				-			-		-
		164.600,00	VA	0,101				-			-		-
		45,00	bh	0,002				-			-		-
2		164.600,00	VA	0,023	164.600,00	100,00	0,023	-			164.600,00	100,00	0,023
3		30,00	m	-				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		1,00	unit	-				-			-		-
2		1,00	unit	-	1,00	100,00		-			1,00	100,00	-
3		1,00	unit	0,012	1,00	100,00	0,012	-			1,00	100,00	0,012
4		1,00	unit	0,007	1,00	100,00	0,007	-			1,00	100,00	0,007
5		1,00	unit	0,013	1,00	100,00	0,013	-			1,00	100,00	0,013
6		8,00	unit	0,058	8,00	100,00	0,058	-			8,00	100,00	0,058
7		4,00	unit	0,030	4,00	100,00	0,030	-			4,00	100,00	0,030
8		12,00	bh	0,058				-			-		-
9		1,00	unit	0,177	1,00	100,00	0,177	-			1,00	100,00	0,177
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		8,00	unit	0,051	8,00	100,00	0,051	-			8,00	100,00	0,051
2		8,00	unit	0,051	8,00	100,00	0,051	-			8,00	100,00	0,051
3		16,00	bh	0,398				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		8,00	unit	0,051	8,00	100,00	0,051	-			8,00	100,00	0,051
2		8,00	unit	0,051	8,00	100,00	0,051	-			8,00	100,00	0,051
3		16,00	bh	0,398				-			-		-
				2,122			0,526						0,526
B	PEKERJAAN KABEL FEEDER												
1		8,00	mtr	0,005				-			-		-
				-				-			-		-
2				-				-			-		-
		56,00	mtr	0,012	56,00	100,00	0,012	-			56,00	100,00	0,012
		58,00	mtr	0,009	58,00	100,00	0,009	-			58,00	100,00	0,009
		49,00	mtr	0,014	49,00	100,00	0,014	-			49,00	100,00	0,014
		31,00	mtr	0,007	31,00	100,00	0,007	-			31,00	100,00	0,007
		77,00	mtr	0,034	77,00	100,00	0,034	-			77,00	100,00	0,034

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
		100,00	mtr	0,027	100,00	100,00	0,027	-			100,00	100,00	0,027
		35,00	mtr	0,009	35,00	100,00	0,009	-			35,00	100,00	0,009
			mtr	-				-			-		-
		30,00	mtr	0,016	27,00	90,00	0,015	-			27,00	90,00	0,015
		31,00	mtr	0,017	27,90	90,00	0,015	-			27,90	90,00	0,015
		70,00	mtr	0,015	70,00	100,00	0,015	-			70,00	100,00	0,015
		59,00	mtr	0,013	59,00	100,00	0,013	-			59,00	100,00	0,013
		58,00	mtr	0,013	58,00	100,00	0,013	-			58,00	100,00	0,013
		46,00	mtr	0,010	46,00	100,00	0,010	-			46,00	100,00	0,010
		65,00	mtr	0,014	65,00	100,00	0,014	-			65,00	100,00	0,014
		65,00	mtr	0,014	65,00	100,00	0,014	-			65,00	100,00	0,014
		53,00	mtr	0,012	53,00	100,00	0,012	-			53,00	100,00	0,012
		52,00	mtr	0,011	52,00	100,00	0,011	-			52,00	100,00	0,011
		28,00	mtr	0,006	28,00	100,00	0,006	-			28,00	100,00	0,006
		16,00	mtr	0,003	16,00	100,00	0,003	-			16,00	100,00	0,003
		23,00	mtr	0,005	23,00	100,00	0,005	-			23,00	100,00	0,005
		22,00	mtr	0,005	22,00	100,00	0,005	-			22,00	100,00	0,005
		77,00	mtr	0,017	77,00	100,00	0,017	-			77,00	100,00	0,017
		65,00	mtr	0,014	65,00	100,00	0,014	-			65,00	100,00	0,014
		64,00	mtr	0,014	64,00	100,00	0,014	-			64,00	100,00	0,014
		52,00	mtr	0,011	52,00	100,00	0,011	-			52,00	100,00	0,011
		71,00	mtr	0,015	71,00	100,00	0,015	-			71,00	100,00	0,015
		70,00	mtr	0,015	70,00	100,00	0,015	-			70,00	100,00	0,015
		58,00	mtr	0,013	58,00	100,00	0,013	-			58,00	100,00	0,013
		57,00	mtr	0,012	57,00	100,00	0,012	-			57,00	100,00	0,012
		47,00	mtr	0,010	47,00	100,00	0,010	-			47,00	100,00	0,010
		35,00	mtr	0,008	35,00	100,00	0,008	-			35,00	100,00	0,008
		35,00	mtr	0,008	35,00	100,00	0,008	-			35,00	100,00	0,008
		23,00	mtr	0,005	23,00	100,00	0,005	-			23,00	100,00	0,005
		41,00	mtr	0,009	41,00	100,00	0,009	-			41,00	100,00	0,009
		40,00	mtr	0,009	40,00	100,00	0,009	-			40,00	100,00	0,009
		28,00	mtr	0,006	28,00	100,00	0,006	-			28,00	100,00	0,006
		27,00	mtr	0,006	27,00	100,00	0,006	-			27,00	100,00	0,006
		77,00	mtr	0,017	77,00	100,00	0,017	-			77,00	100,00	0,017
		65,00	mtr	0,014	65,00	100,00	0,014	-			65,00	100,00	0,014
		64,00	mtr	0,014	64,00	100,00	0,014	-			64,00	100,00	0,014
		52,00	mtr	0,011	52,00	100,00	0,011	-			52,00	100,00	0,011
		71,00	mtr	0,015	71,00	100,00	0,015	-			71,00	100,00	0,015
		70,00	mtr	0,015	70,00	100,00	0,015	-			70,00	100,00	0,015
		58,00	mtr	0,013	58,00	100,00	0,013	-			58,00	100,00	0,013
		57,00	mtr	0,012	57,00	100,00	0,012	-			57,00	100,00	0,012
		47,00	mtr	0,010	47,00	100,00	0,010	-			47,00	100,00	0,010
		35,00	mtr	0,008	35,00	100,00	0,008	-			35,00	100,00	0,008
		35,00	mtr	0,008	35,00	100,00	0,008	-			35,00	100,00	0,008
		23,00	mtr	0,005	23,00	100,00	0,005	-			23,00	100,00	0,005
		41,00	mtr	0,009	41,00	100,00	0,009	-			41,00	100,00	0,009
		40,00	mtr	0,009	40,00	100,00	0,009	-			40,00	100,00	0,009
		28,00	mtr	0,006	28,00	100,00	0,006	-			28,00	100,00	0,006
		27,00	mtr	0,006	27,00	100,00	0,006	-			27,00	100,00	0,006
				-				-			-		
3				-				-			-		
			mtr	-				-			-		-
4				-				-			-		
			mtr	-				-			-		-
				-				-			-		
5				-				-			-		
			mtr	-				-			-		-
				-				-			-		
6				-				-			-		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
		23,00	mtr	0,005	23,00	100,00	0,005	-			23,00	100,00	0,005
		25,00	mtr	0,006	25,00	100,00	0,006	-			25,00	100,00	0,006
		-		-				-			-		
7				-				-			-		
		17,00	mtr	0,004	17,00	100,00	0,004	-			17,00	100,00	0,004
		-		-				-			-		
8				-				-			-		
		10,00	mtr	0,002	5,00	50,00	0,001	-			5,00	50,00	0,001
		13,00	mtr	0,003	6,50	50,00	0,002	-			6,50	50,00	0,002
				0,635			0,624						0,624
C PEKERJAAN PENTANAHAN													
1		18,00	m	0,002	18,00	100,00	0,002	-			18,00	100,00	0,002
2		1,00	bh	0,008	1,00	100,00	0,008	-			1,00	100,00	0,008
3		1,00	bh	0,004	1,00	100,00	0,004	-			1,00	100,00	0,004
4		7,00	bh	0,022	7,00	100,00	0,022	-			7,00	100,00	0,022
5		7,00	bh	0,008	7,00	100,00	0,008	-			7,00	100,00	0,008
6		1,00	bh	0,000	1,00	100,00	0,000	-			1,00	100,00	0,000
7		1,00	bh	0,003	1,00	100,00	0,003	-			1,00	100,00	0,003
				0,047			0,047						0,047
D PEKERJAAN PROTEKSI PETIR ROOF													
1		10,00	bh	0,136	10,00	100,00	0,136	-			10,00	100,00	0,136
2		10,00	bh	0,104	10,00	100,00	0,104	-			10,00	100,00	0,104
3		70,00	m	0,007	70,00	100,00	0,007	-			70,00	100,00	0,007
4		70,00	bh	0,010	70,00	100,00	0,010	-			70,00	100,00	0,010
		-		-				-			-		
		-		-				-			-		
1		76,00	m	0,008	76,00	100,00	0,008	-			76,00	100,00	0,008
2		19,00	btg	0,003	19,00	100,00	0,003	-			19,00	100,00	0,003
		-		-				-			-		
		-		-				-			-		
1		2,00	bh	0,008	2,00	100,00	0,008	-			2,00	100,00	0,008
2		14,00	bh	0,044	14,00	100,00	0,044	-			14,00	100,00	0,044
3		14,00	bh	0,016	14,00	100,00	0,016	-			14,00	100,00	0,016
4		2,00	bh	0,001	2,00	100,00	0,001	-			2,00	100,00	0,001
5		2,00	bh	0,005	2,00	100,00	0,005	-			2,00	100,00	0,005
				0,341			0,341						0,341
E PEKERJAAN KABEL LADDER & TRAY													
								-			-		-
								-			-		-
1		83,00	m	0,139	83,00	100,00	0,139	-			83,00	100,00	0,139
2		8,00	m	0,013	8,00	100,00	0,013	-			8,00	100,00	0,013
		-		-				-			-		-
		-		-				-			-		-
1		79,00	m	0,132	79,00	100,00	0,132	-			79,00	100,00	0,132
		-		-				-			-		-
		-		-				-			-		-
1		79,00	m	0,132	79,00	100,00	0,132	-			79,00	100,00	0,132
				0,417			0,417						0,417

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
F	ARMATURE LAMPU & INSTALASINYA												
1		6,00	bh	0,004	6,00	100,00	0,004	-			6,00	100,00	0,004
2		2,00	bh	0,008	2,00	100,00	0,008	-			2,00	100,00	0,008
3		31,00	bh	0,023	31,00	100,00	0,023	-			31,00	100,00	0,023
4		7,00	bh	0,024	7,00	100,00	0,024	-			7,00	100,00	0,024
5		6,00	bh	0,006	4,00	66,67	0,004	2,0	33,33	0,002	6,00	100,00	0,006
6		3,00	bh	0,015				3,0	100,00	0,015	3,00	100,00	0,015
7		1,00	bh	0,003	1,00	100,00	0,003	-			1,00	100,00	0,003
8		2,00	bh	0,014	2,00	100,00	0,014	-			2,00	100,00	0,014
9		6,00	bh	0,042	6,00	100,00	0,042	-			6,00	100,00	0,042
10		2,00	bh	0,020	2,00	100,00	0,020	-			2,00	100,00	0,020
11		6,00	bh	0,030	3,00	50,00	0,015	3,0	50,00	0,015	6,00	100,00	0,030
				-				-			-		-
12		71,00	titik	0,153	71,00	100,00	0,153	-			71,00	100,00	0,153
13		19,00	titik	0,041	19,00	100,00	0,041	-			19,00	100,00	0,041
				-							-		-
				-							-		-
1		36,00	bh	0,026	36,00	100,00	0,026	-			36,00	100,00	0,026
2		24,00	bh	0,017	22,00	91,67	0,016	2,0	8,33	0,001	24,00	100,00	0,017
3		24,00	bh	0,083	24,00	100,00	0,083	-			24,00	100,00	0,083
				-				-			-		-
4		84,00	titik	0,150	84,00	100,00	0,150	-			84,00	100,00	0,150
5		24,00	titik	0,052	24,00	100,00	0,052	-			24,00	100,00	0,052
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		27,00	bh	0,020	27,00	100,00	0,020	-			27,00	100,00	0,020
2		4,00	bh	0,014	4,00	100,00	0,014	-			4,00	100,00	0,014
3		2,00	bh	0,010				-			-		-
4		1,00	bh	0,003	1,00	100,00	0,003	-			1,00	100,00	0,003
5		2,00	bh	0,014	2,00	100,00	0,014	-			2,00	100,00	0,014
6		6,00	bh	0,030	3,00	50,00	0,015	3,0	50,00	0,015	6,00	100,00	0,030
				-				-			-		-
7		39,00	titik	0,084	39,00	100,00	0,084	-			39,00	100,00	0,084
8		9,00	titik	0,019	9,00	100,00	0,019	-			9,00	100,00	0,019
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		48,00	bh	0,035	48,00	100,00	0,035	-			48,00	100,00	0,035
2		32,00	bh	0,023	32,00	100,00	0,023	-			32,00	100,00	0,023
3		32,00	bh	0,111	32,00	100,00	0,111	-			32,00	100,00	0,111
				-				-			-		-
4		112,00	titik	0,200	112,00	100,00	0,200	-			112,00	100,00	0,200
5		35,00	titik	0,076	35,00	100,00	0,076	-			35,00	100,00	0,076
				-							-		-
				-							-		-
1		27,00	bh	0,020	27,00	100,00	0,020	-			27,00	100,00	0,020
2		4,00	bh	0,014	4,00	100,00	0,014	-			4,00	100,00	0,014
3		3,00	bh	0,015				-			-		-
4		1,00	bh	0,003	1,00	100,00	0,003	-			1,00	100,00	0,003
5		2,00	bh	0,014	2,00	100,00	0,014	-			2,00	100,00	0,014
6		5,00	bh	0,025	3,00	60,00	0,015	2,0	40,00	0,010	5,00	100,00	0,025
				-				-			-		-
7		40,00	titik	0,086	40,00	100,00	0,086	-			40,00	100,00	0,086

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
8		11,00	titik	0,024	11,00	100,00	0,024	-			11,00	100,00	0,024
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		48,00	bh	0,035	48,00	100,00	0,035	-			48,00	100,00	0,035
2		32,00	bh	0,023	32,00	100,00	0,023	-			32,00	100,00	0,023
3		32,00	bh	0,111	32,00	100,00	0,111	-			32,00	100,00	0,111
				-				-			-		-
4		112,00	titik	0,200	112,00	100,00	0,200	-			112,00	100,00	0,200
5		32,00	titik	0,069	32,00	100,00	0,069	-			32,00	100,00	0,069
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		2,00	bh	0,001				-			-		-
2		2,00	bh	0,010				-			-		-
3		2,00	bh	0,010				-			-		-
				-				-			-		-
4		6,00	titik	0,013				-			-		-
				2,023			1,907			0,058			1,964
G	SAKLAR, STOP KONTAK & INSTALASINYA												
1		10,00	bh	0,002	7,00	70,00	0,001	-			7,00	70,00	0,001
2		9,00	bh	0,002	7,00	77,78	0,001	-			7,00	77,78	0,001
3		3,00	bh	0,002				-			-		-
4		1,00	bh	0,001				-			-		-
5		19,00	bh	0,004	19,00	100,00	0,004	-			19,00	100,00	0,004
6		4,00	bh	0,001				-			-		-
				-				-			-		-
7		23,00	titik	0,056	23,00	100,00	0,056	-			23,00	100,00	0,056
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		36,00	bh	0,006	33,00	91,67	0,005	-			33,00	91,67	0,005
2		24,00	bh	0,004	22,00	91,67	0,004	-			22,00	91,67	0,004
3		72,00	bh	0,016	72,00	100,00	0,016	-			72,00	100,00	0,016
4		12,00	bh	0,003	12,00	100,00	0,003	-			12,00	100,00	0,003
5		12,00	bh	0,003	12,00	100,00	0,003	-			12,00	100,00	0,003
6		12,00	bh	0,003	12,00	100,00	0,003	-			12,00	100,00	0,003
7		36,00	bh	0,008	4,00	11,11	0,001	-			4,00	11,11	0,001
				-				-			-		-
8		144,00	titik	0,292	144,00	100,00	0,292	-			144,00	100,00	0,292
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		6,00	bh	0,001	5,00	83,33	0,001	-			5,00	83,33	0,001
2		3,00	bh	0,001	2,00	66,67	0,000	-			2,00	66,67	0,000
3		6,00	bh	0,004				-			-		-
4		7,00	bh	0,002	6,00	85,71	0,001	-			6,00	85,71	0,001
				-				-			-		-
5		7,00	titik	0,017	7,00	100,00	0,017	-			7,00	100,00	0,017
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		48,00	bh	0,008	47,00	97,92	0,008	-			47,00	97,92	0,008
2		32,00	bh	0,006	31,00	96,88	0,006	-			31,00	96,88	0,006
3		96,00	bh	0,021	95,00	98,96	0,021	-			95,00	98,96	0,021
4		16,00	bh	0,003	15,00	93,75	0,003	-			15,00	93,75	0,003
5		16,00	bh	0,003	15,00	93,75	0,003	-			15,00	93,75	0,003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
6		16,00	bh	0,003	15,00	93,75	0,003	-			15,00	93,75	0,003
7		48,00	bh	0,010	47,00	97,92	0,010	-			47,00	97,92	0,010
				-				-			-		-
8		192,00	titik	0,390	192,00	100,00	0,390	-			192,00	100,00	0,390
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		6,00	bh	0,001	5,00	83,33	0,001	-			5,00	83,33	0,001
2		3,00	bh	0,001	2,00	66,67	0,000	-			2,00	66,67	0,000
3		5,00	bh	0,003				-			-		-
4		7,00	bh	0,002	6,00	85,71	0,001	-			6,00	85,71	0,001
				-				-			-		-
5		7,00	titik	0,017	7,00	100,00	0,017	-			7,00	100,00	0,017
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		48,00	bh	0,008	47,00	97,92	0,008	-			47,00	97,92	0,008
2		32,00	bh	0,006	31,00	96,88	0,006	-			31,00	96,88	0,006
3		96,00	bh	0,021	95,00	98,96	0,021	-			95,00	98,96	0,021
4		16,00	bh	0,003	15,00	93,75	0,003	-			15,00	93,75	0,003
5		16,00	bh	0,003	15,00	93,75	0,003	-			15,00	93,75	0,003
6		16,00	bh	0,003	15,00	93,75	0,003	-			15,00	93,75	0,003
7		48,00	bh	0,016	47,00	97,92	0,016	-			47,00	97,92	0,016
				-				-			-		-
8		192,00	titik	0,390	192,00	100,00	0,390	-			192,00	100,00	0,390
				1,344			1,320						1,320
H	TESTING DAN COMMISSIONING												
1	Testing dan Commissioning	1,00	lot	0,034				-			-		-
				0,034									-
				6,963			5,182			0,058			5,240
V PEKERJAAN FIRE ALARM SARWA 3 LANTAI													
A													
1		1,00	unit	0,260				-			-		-
2			unit	-				-			-		-
3			unit	-				-			-		-
4		1,00	unit	0,018				-			-		-
5		1,00	unit	0,074				-			-		-
				0,352									-
B													
1		10,00	m	0,005	10,00	100,00	0,005	-			10,00	100,00	0,005
2		7,00	m	0,003				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		10,00	m'	0,003				-			-		-
2		20,00	m'	0,005				-			-		-
3		20,00	m'	0,005				-			-		-
4		30,00	m'	0,008				-			-		-
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		50,00	m'	0,013	50,00	100,00	0,013	-			50,00	100,00	0,013
				0,042			0,018	-					0,018
C													

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
1		1,00	unit	0,040	1,00	100,00	0,040	-			1,00	100,00	0,040
2		45,00	bh	0,159	22,00	48,89	0,078	23,0	51,11	0,081	45,00	100,00	0,159
3		11,00	bh	0,012	5,00	45,45	0,005	6,0	54,55	0,006	11,00	100,00	0,012
4		12,00	bh	0,023				-			-		-
5		12,00	bh	0,011				-			-		-
6		1,00	bh	0,001				-			-		-
7		1,00	bh	0,001				-			-		-
				-				-			-		-
8		68,00	ttk	0,109	68,00	100,00	0,109	-			68,00	100,00	0,109
9		12,00	ttk	0,024	12,00	100,00	0,024	-			12,00	100,00	0,024
10		1,00	ttk	0,003	1,00	100,00	0,003	-			1,00	100,00	0,003
11		1,00	ttk	0,003	1,00	100,00	0,003	-			1,00	100,00	0,003
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		1,00	unit	0,040	1,00	100,00	0,040	-			1,00	100,00	0,040
2		52,00	bh	0,184	25,00	48,08	0,089	27,0	51,92	0,096	52,00	100,00	0,184
3		11,00	bh	0,012	5,00	45,45	0,005	6,0	54,55	0,006	11,00	100,00	0,012
4		16,00	bh	0,031				-			-		-
5		16,00	bh	0,014				-			-		-
6		1,00	bh	0,001				-			-		-
7		1,00	bh	0,001				-			-		-
				-				-			-		-
6		79,00	ttk	0,126	79,00	100,00	0,126	-			79,00	100,00	0,126
7		16,00	ttk	0,032	16,00	100,00	0,032	-			16,00	100,00	0,032
10		1,00	ttk	0,003	1,00	100,00	0,003	-			1,00	100,00	0,003
11		1,00	ttk	0,003	1,00	100,00	0,003	-			1,00	100,00	0,003
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		1,00	unit	0,040				-			-		-
2		52,00	bh	0,184				-			-		-
3		11,00	bh	0,012				-			-		-
4		16,00	bh	0,031				-			-		-
5		16,00	bh	0,014				-			-		-
6		1,00	bh	0,001				-			-		-
7		1,00	bh	0,001				-			-		-
				-				-			-		-
6		79,00	ttk	0,126	79,00	100,00	0,126	-			79,00	100,00	0,126
7		16,00	ttk	0,032	16,00	100,00	0,032	-			16,00	100,00	0,032
10		2,00	ttk	0,006	2,00	100,00	0,006	-			2,00	100,00	0,006
11		2,00	ttk	0,006	2,00	100,00	0,006	-			2,00	100,00	0,006
				1,286			0,731			0,190			0,921
D	Testing dan Commissioning												
1	Testing dan Commissioning	1,00	lot	0,032				-			-		-
				0,032									-
				1,712			0,749			0,190			0,939
VI.	PEKERJAAN CCTV ARUNIKA 3 LANTAI												
A													
1		1,00	unit	0,034				-			-		-
2		1,00	unit	0,014				-			-		-
3		1,00	unit	0,023				-			-		-
4		1,00	unit	0,012				-			-		-
5		1,00	unit	0,003				-			-		-
6		1,00	unit	0,004				-			-		-

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
				0,090									-
B.													
1		4,00	bh	0,044	4,00	100,00	0,044	-			4,00	100,00	0,044
2		11,00	bh	0,121				-			-		-
				-				-			-		-
3		15,00	ttk	0,099	15,00	100,00	0,099	-			15,00	100,00	0,099
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		3,00	bh	0,033				-			-		-
				-				-			-		-
2		3,00	ttk	0,020	3,00	100,00	0,020	-			3,00	100,00	0,020
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		3,00	bh	0,033				-			-		-
				-				-			-		-
2		3,00	ttk	0,020	3,00	100,00	0,020	-			3,00	100,00	0,020
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		2,00	bh	0,022				-			-		-
				-				-			-		-
2		2,00	ttk	0,013	2,00	100,00	0,013	-			2,00	100,00	0,013
				0,405			0,196						0,196
C													
1		73,00	m	0,168	73,00	100,00	0,168	-			73,00	100,00	0,168
2		8,00	m	0,018	8,00	100,00	0,018	-			8,00	100,00	0,018
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		74,00	m	0,170	74,00	100,00	0,170	-			74,00	100,00	0,170
				-				-			-		-
				-				-			-		-
1		74,00	m	0,170	74,00	100,00	0,170	-			74,00	100,00	0,170
				0,527			0,527						0,527
D	TESTING DAN COMMISSIONING												
1	Testing dan Commissioning	1,00	lot	0,030				-			-		-
				0,030									-
				1,052			0,723						0,723
VI	PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) RUMAH SUSUN												
			m2	-				-			-		-
			Unit	-				-			-		-
			Unit	-				-			-		-
			Unit	-				-			-		-
			Unit	-				-			-		-
			m2	-				-			-		-
			m	-				-			-		-
			m	-				-			-		-
			-	-				-			-		-
		30,53	m3	0,223	30,53	100,00	0,223	-			30,53	100,00	0,223

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT	VOLUME	PRESTASI	BOBOT
						%	%		%	%		%	%
		1.663,43	kg	0,123	1.663,43	100,00	0,123	-			1.663,43	100,00	0,123
		440,96	m2	0,305	440,96	100,00	0,305	-			440,96	100,00	0,305
		5,09	m3	0,006	5,09	100,00	0,006	-			5,09	100,00	0,006
		5,09	m3	0,023	5,09	100,00	0,023	-			5,09	100,00	0,023
		71,23	m3	0,034	71,23	100,00	0,034	-			71,23	100,00	0,034
			Unit	-				-			-		-
				-				-			-		-
		0,78	m3	0,006	0,78	100,00	0,006	-			0,78	100,00	0,006
		42,72	kg	0,003	42,72	100,00	0,003	-			42,72	100,00	0,003
		14,56	m2	0,010	14,56	100,00	0,010	-			14,56	100,00	0,010
			Unit	-				-			-		-
				-				-			-		-
		10,18	m3	0,074				-			-		-
		554,48	kg	0,041				-			-		-
		101,76	m2	0,070				-			-		-
			Unit	-				-			-		-
			Unit	-				-			-		-
			Unit	-				-			-		-
		2,00	titik	0,082				-			-		-
			Unit	-				-			-		-
			m	-				-			-		-
		25,69	m3	0,188	3,00	11,68	0,022	21,4	83,32	0,156	24,41	95,00	0,178
		1.399,79	m3	0,104	1.259,81	90,00	0,093	70,0	5,00	0,005	1.329,80	95,00	0,098
		371,07	kg	0,257	185,54	50,00	0,128	167,0	45,00	0,116	352,52	95,00	0,244
		4,28	m2	0,005	4,28	100,00	0,005	-			4,28	100,00	0,005
		4,28	m3	0,019	4,28	100,00	0,019	-			4,28	100,00	0,019
		56,96	m3	0,027	56,96	100,00	0,027	-			56,96	100,00	0,027
			m3	-				-			-		-
				-				-			-		-
		8,44	m3	0,062				4,2	50,00	0,031	4,22	50,00	0,031
		460,06	kg	0,034				230,0	50,00	0,017	230,03	50,00	0,017
		76,81	m2	0,053				38,4	50,00	0,027	38,40	50,00	0,027
			m2	-				-			-		-
			m2	-				-			-		-
			m2	-				-			-		-
				1,749			1,027			0,351			1,379
				100,000			94,947			1,033			95,980
	TOTAL PEKERJAAN												
